

คู่มือการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(สงป.301/302) ประจำปี 2564 ของหน่วยงาน

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE)



กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงานและวิชาการ
กรมวิชาการเกษตร

วัตถุประสงค์

กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดทำคู่มือการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ของหน่วยงาน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรใช้ประกอบในการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE 2) ขั้นตอนการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE 3) ประเภทของผู้ใช้งานโปรแกรม SCE 4) แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 5) ประเภทรายจ่าย 6) รอบเวลาการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และแนบแบบรายงานในโปรแกรม SCE 7) วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise 8) วิธีการเข้าโปรแกรม SCE 9) การเข้าในนามผู้ใช้งานแต่ละประเภท

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301/302) ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร

ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301/302) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม SCE

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ

1. รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณ
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564



2. สร้างโครงสร้างผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมของทุก
หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรตามที่ได้รับจัดสรร



3. แจ้งผู้รับผิดชอบการรายงาน สงป.301/302 ของทุกหน่วยงาน ผ่านหนังสือ/Application
Line/E-mail ดังนี้

- 3.1 ให้หน่วยงานตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณในโปรแกรม SCE
- 3.2 แจ้งระยะเวลาการแจ้งเปิด-ปิดสิทธิ์ในโปรแกรม SCE
- 3.3 แจ้งแบบฟอร์มของผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม (รายงานเชิงคุณภาพ)
- 3.4 แจ้งระยะเวลาการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรม SCE (รายงานเชิงปริมาณ)

ขั้นตอนการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สพ.301/302) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม SCE

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกรมวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบการรายงาน สพ.301/302



1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงานและวิชาการ
(ผู้รับผิดชอบใหม่/ผู้ยังไม่เคยใช้งาน)


เข้าเว็บไซต์

<http://me.doa.go.th/>


2. ดาวน์โหลดคู่มือ/ติดตั้งโปรแกรม SCE/
เข้าระบบโดยใช้ “รหัสผู้ใช้” และ
“รหัสผ่าน” ของหน่วยงาน




3. เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ

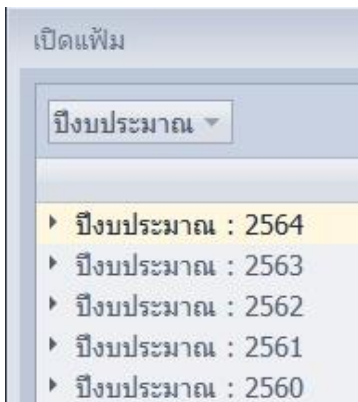

4. ตรวจสอบทุกแฟ้มผลลัพธ์/
โครงการที่ปรากฏบนหน้าจอ



5. ตรวจสอบตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณที่ปรากฏ (อักษรสีน้ำเงิน)
เทียบกับแผนของหน่วยงาน

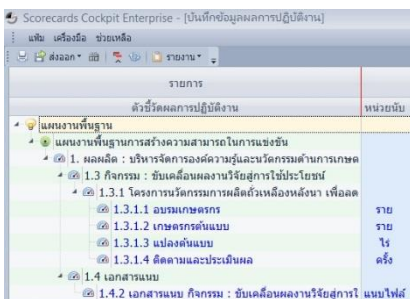

6. แจ้งเปิด - ปิดสิทธิ์ในกรณีที่มี
การปรับเปลี่ยน

7. การรายงานผ่านโปรแกรม SCE

แผนการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสนับสนุน

บันทึกแผนให้ครบ 12 เดือน ภายในเดือนมีนาคม

ตัดยอด ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

แนบรายงานเชิงคุณภาพ (รายงานตามแบบฟอร์ม) ให้ครบตามรอบเวลา

3. ประเภทของผู้ใช้งานโปรแกรม SCE

ผู้ใช้งาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.1 **ผู้บันทึก ระดับกอง/สถาบัน/สำนัก** โดยผู้ใช้งานจะได้รับ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” จำนวน 2 ชุด เพื่อการใช้งานในหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้

2.1.1 **ผู้บันทึก** คือ ใช้สำหรับบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานตนเองมีแผนปฏิบัติ

2.1.2 **ผู้รับรอง** คือ ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถดูข้อมูลการบันทึกทั้งหมดของหน่วยงานภายใต้สังกัดได้ (รหัสผู้ใช้ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า Admin)

2.2 **ผู้บันทึก ระดับศูนย์จังหวัด** โดยผู้ใช้งานจะได้รับ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานตนเองมีแผนปฏิบัติ

4. แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

กรมวิชาการเกษตรมีแผนการปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งออกเป็น 4 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2. แผนงานพื้นฐาน 3. แผนงานยุทธศาสตร์ 4. แผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต และ 9 โครงการ ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ

2. แผนงานพื้นฐาน

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2 ผลผลิต)

2.1.1 ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร

กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร

กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรม : การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

2.1.2 ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม : การตรวจปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช/ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.

กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช

3. แผนงานยุทธศาสตร์

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังทางสังคม

3.1.1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ

กิจกรรม : สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

กิจกรรม : การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

กิจกรรม : พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

3.2.2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

3.2.3 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา

3.2.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

3.2.5 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์

กิจกรรม : เกษตรทฤษฎีใหม่

4. แผนงานบูรณาการ

4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.1.1 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

4.2.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

4.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

4.3.1 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

โดยมีแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรม SCE) ดังตารางที่ 1.1 – 1.2

5. ประเภทรายจ่าย

ให้บันทึกเงินงบประมาณที่ได้รับจริง รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการโอนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการจัดสรรตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณตามจริงในแต่ละเดือน โดยตัดยอดให้ตรงกับ GFMS รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหมวดเงินด้วย โดยแยกตามประเภทรายจ่าย จำแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ และพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว กรณีหน่วยงานมีค่าจ้างเหมาแรงงานให้ระบุจำนวนคนด้วย

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุง หรือเพื่อช่วยเหลือ แบ่งเป็น

1. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบำรุงสมาชิก
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ และตามรายละเอียดที่สำนักงาน

งบประมาณกำหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงานงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

6. รอบเวลาการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และแนบแบบรายงานในโปรแกรม SCE

1. บันทึกแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครบ 12 เดือน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564

2. บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

2.1 บันทึกผลการปฏิบัติงาน ตัดยอดการรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน บันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 25 มีนาคม 2564 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564

ยกเว้น

- กิจกรรม : ตรวจสอบแปลง GAP/ตรวจสอบโรงงาน GMP และ กิจกรรม : ตรวจสอบแปลงอินทรีย์ ตัดยอดหลังจากเข้าคณะกรรมการรับรอง (CC) ของแต่ละเดือน แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

- การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง ตัดยอดทุกสิ้นเดือน แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564

2.2 บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตัดยอดการรายงาน ดังนี้

- **หน่วยงานส่วนกลาง** : ตัดยอดจากที่หน่วยงานนำใบสำคัญมาส่งที่กลุ่มเงินนอกงบประมาณ กคง. ในวันสุดท้ายของเดือน

- **หน่วยงานส่วนภูมิภาค** : ตัดยอดจากการวางเบิกในระบบ GF ในวันสุดท้ายของเดือน

3. แนบไฟล์ข้อมูลสนับสนุนตามแบบรายงานของผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ **ดังตารางที่ 2** และดูชื่อตัวชี้วัด ชื่อแบบฟอร์มรายงานและรอบการส่งได้ **ดังตารางที่ 3** โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง <http://me.doa.go.th/>

3.1 การรายงานครั้งแรก

- รายงานแบบรายเดือน เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 25 มีนาคม 2564 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564

- รายงานแบบราย 6 เดือน เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 25 มีนาคม 2564 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564

- รายงานแบบรายปี เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

3.2 การรายงานครั้งถัดไป

- รายงานแบบรายเดือน แนบไฟล์ในระบบภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป

- รายงานแบบราย 6 เดือน และ รายงานแบบรายปี แนบไฟล์ในระบบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564


7. วิธีดาวน์โหลดโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise

8


ผู้บันทึกต้องติดตั้งโปรแกรม SCE ก่อนการใช้งาน ดังนี้

7.1 เข้าเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร (www.doa.go.th)

7.2. เลือกที่เมนู รายงานสงป./พันธุ์พืช

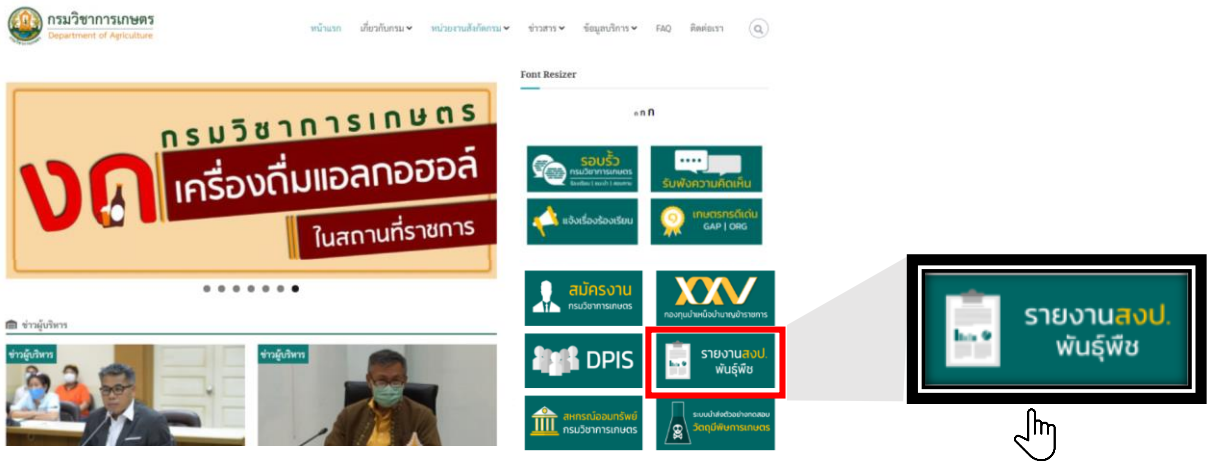


7.3 ดาวน์โหลดโปรแกรม Scorecards Cockpit Enterprise (SCE)

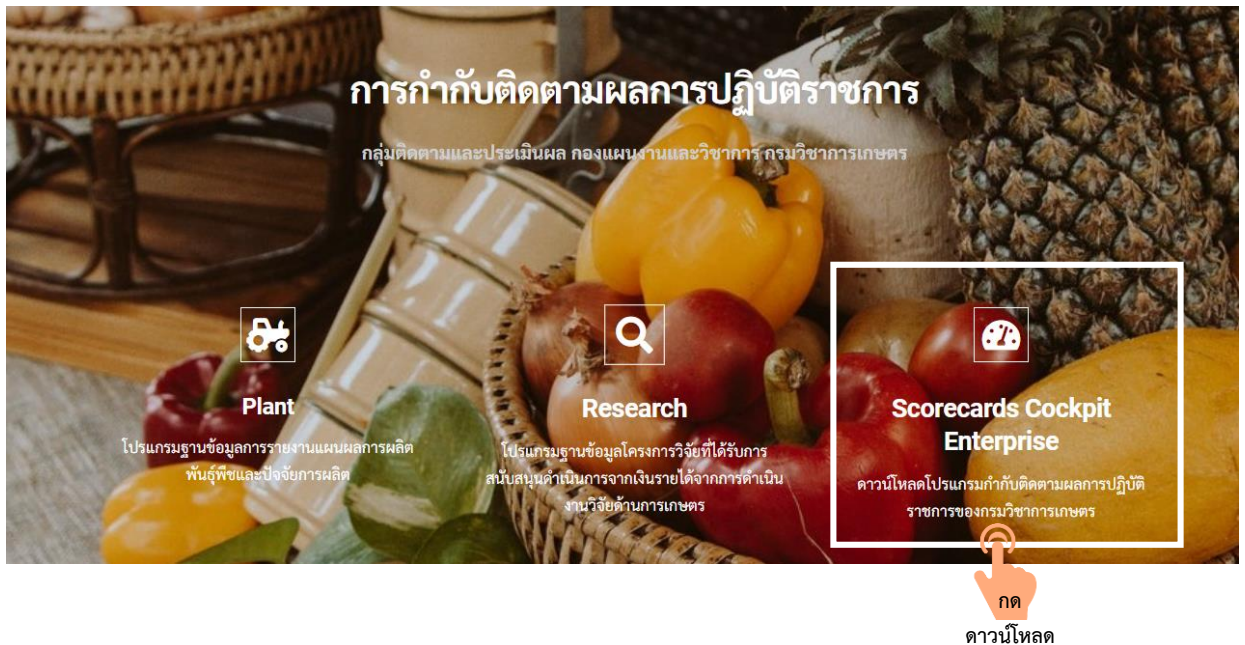


8. วิธีการเข้าโปรแกรม SCE


8.1 การลงชื่อเข้าใช้งาน โดยใส่ รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

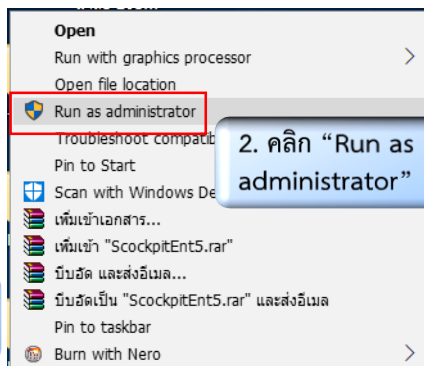

3. ใส่ "รหัสผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน"

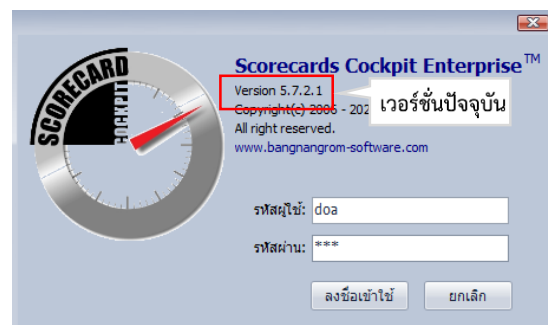


1. ดับเบิลคลิก จะปรากฏดังข้อ 3
2. คลิกขวา จะปรากฏดังข้อ 2

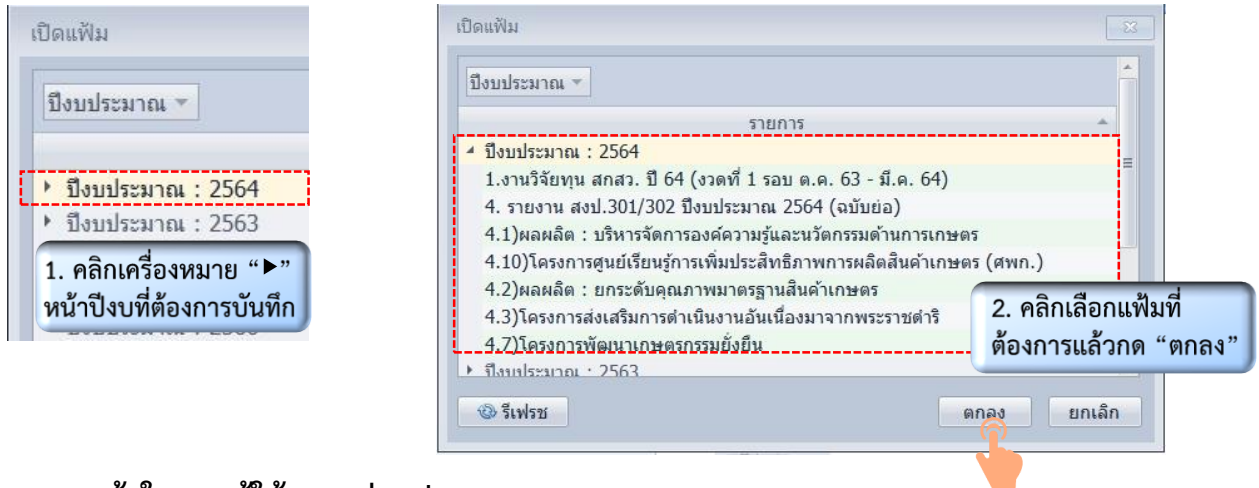

9. การเข้าในนามผู้ใช้งานแต่ละประเภท

9.1 เข้าในนามผู้บันทึก ระดับศูนย์จังหวัด และ ระดับกอง/สถาบัน/สำนัก

9.1.1 ส่วนประกอบของหน้าจอเริ่มต้น

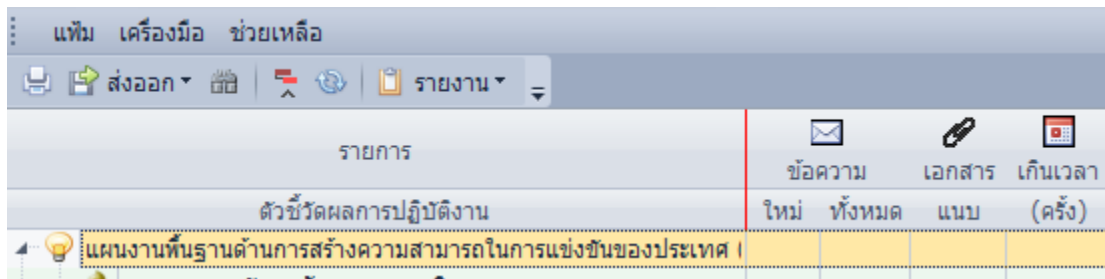


ส่งออก : สามารถส่งออกข้อมูลในหน้าจอเริ่มต้นและในหน้ารายงานต่าง ๆ เป็นไฟล์นามสกุลอื่นได้ เช่น Excel



ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ : เป็นทางลัดในการค้นหากิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องการ



ย่อโครงสร้าง : ย่อ/ขยายโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

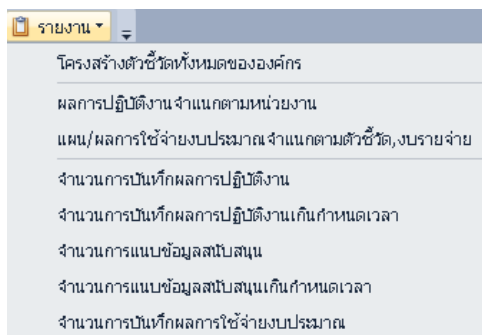

รายงาน : ผู้บันทึกสามารถเรียกดูรายงานของหน่วยงานตนเอง และผู้รับรองสามารถเรียกดูรายงานภาพรวมของหน่วยงานภายใต้สังกัดได้จากเมนูนี้



ข้อความ : แสดงจำนวนข้อความที่ผู้บันทึกทำการบันทึก เพื่อระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน หรือรายละเอียดผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าเพิ่มเติม



เอกสารแนบ : แสดงจำนวนไฟล์ข้อมูลที่ผู้บันทึกแนบผ่านตัวชี้วัดนั้น ๆ

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

เพิ่ม เครื่องมือ ช่วยเหลือ

ส่งออก ติว รายงาน

รายการ		ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี				
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน		หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์						
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม						
3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			0.00	602,800.00	554.00	0.09
3.1 กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ			0.00	402,800.00	554.00	0.14
3.1.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี			0.00	100,898.00	385.00	0.38
3.1.2.1 โครงการพระราชดำริ*			890.00	890.00	385.00	43.26
3.1.2.1 (1) อบรมเกษตรกร (ราย)			840.00	840.00	360.00	42.86
3.1.2.1 (1.1) สวพ.1 (ราย)			840.00	840.00	360.00	42.86
3.1.2.1 (1.1.1) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำห้วยน้ำเคือง		ราย	30.00	30.00	0.00	0.00
3.1.2.1 (1.1.2) โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง บ้านขุนแตะ จ.เชียงใหม่		ราย	30.00	30.00	30.00	100.00
3.1.2.1 (1.1.3) โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง บ้านดงดิง จ.เชียงใหม่		ราย	30.00	30.00	0.00	0.00
3.1.2.1 (1.1.4) โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		ราย	240.00	240.00	0.00	0.00
3.1.2.1 (1.1.5) โครงการป่าชุมชนแม่กวางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		ราย	60.00	60.00	0.00	0.00
3.1.2.1 (1.1.6) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่		ราย	30.00	30.00	0.00	0.00
3.1.2.1 (1.1.7) โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ		ราย	30.00	30.00	0.00	0.00
3.1.2.1 (1.1.8) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่		ราย	30.00	30.00	0.00	0.00
3.1.2.1 (1.1.9) โครงการกู่ฟ้าพัฒนา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (รพ.)		ราย	30.00	30.00	0.00	0.00
3.1.2.1 (1.1.10) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา		ราย	330.00	330.00	330.00	100.00
3.1.2.1 (2) แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต (ไร่)			50.00	50.00	25.00	50.00
3.1.2.1 (3) งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)			0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่*			100,008.00	100,008.00	0.00	0.00
3.1.2.3 (1) บริการเบ็ดเสร็จ 02 (ราย)		ราย		0.00	0.00	0.00
3.1.2.3 (3) จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ครั้ง)		ครั้ง	8.00	8.00	0.00	0.00
3.1.2.3 (4) งบประมาณ (บาท)		บาท	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
3.1.3 กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร			0.00	301,902.00	164.00	0.05
3.1.4 เอกสารแนบ (รายงานผลการปฏิบัติงาน รายไตรมาส)			0.00	0.00	5.00	0.00
3.1.4 (1) สวพ.1 (เอกสาร)			0.00	0.00	5.00	0.00
3.1.4 (1.1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (เอกสาร)		เอกสาร		0.00	0.00	0.00
3.1.4 (1.4) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินฯ ลุ่มน้ำแม่หาด (มี)		เอกสาร		0.00	0.00	0.00
3.1.4 (1.5) โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง บ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่		เอกสาร		0.00	1.00	0.00
3.1.4 (1.6) โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง บ้านแม่ต๋อน อ.เมือง จ.เชียงใหม่		เอกสาร		0.00	1.00	0.00

1 ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ ตัวชี้วัดสำหรับบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และแนบไฟล์ข้อมูลสนับสนุน (แบบฟอร์มรายงาน)

2 หน่วยนับ คือ สำหรับระบุหน่วยนับที่สอดคล้องกับกิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องบันทึก หรือแนบไฟล์ข้อมูล

แผนจัดสรร คือ ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดและจำนวนงบประมาณที่กรมจัดสรรให้หน่วยงานในการดำเนินกิจกรรม ซึ่ง กผง. เป็นผู้บันทึก

แผนรวม/ผลรวม คือ ผลรวมของการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละเดือน ซึ่งผู้บันทึกของหน่วยงานเป็นผู้บันทึก

ร้อยละ (ภายใต้หัวข้อผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี) คำนวณมาจากผลการปฏิบัติงานหรือผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผนจัดสรร

3 ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ เป็นข้อมูลที่ กผง. หรือ ผู้บันทึกเป็นผู้บันทึก เมื่อผู้บันทึกบันทึกโปรแกรมจะประมวลผลทันทีในระดับตัวชี้วัดที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ

ตัวอักษรสีดำ คือ ผลรวมของข้อมูลที่อยู่ภายใต้หัวข้อนั้น ๆ ซึ่งได้มาจากการกำหนดสูตรของ กผง. และจะอัปเดตข้อมูลเมื่อโปรแกรมมีการประมวลผลระดับกรมเท่านั้น

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]															
1															
2															
รายการ				ไตรมาส 1						รวมไตรมาส1					
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน		หน่วยนับ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมไตรมาส1			
				แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์															
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม															
3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ															
3.1 กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ															
3.1.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี															
3.1.2.1 โครงการพระราชดำริ*															
3.1.2.1 (1) อบรมเกษตรกร (ราย)															
3.1.2.1 (1.1) สวพ.1 (ราย)															
3.1.2.1 (1.1.1) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระเมฆอมแผ่นดิน															
3.1.2.1 (1.1.2) โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง บ้านขุนและ															
3.1.2.1 (1.1.3) โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง บ้านดงตั้ง จ															
3.1.2.1 (1.1.4) โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง															
3.1.2.1 (1.1.5) โครงการบ้านแมกวงอันเนื่องมาจากพระ															

1

โปรแกรมจะแสดงแผน ผล ร้อยละ ของทุกเดือน (12 เดือน) โดย

- **แผนและผล** ได้มาจากข้อมูลที่ผู้บันทึกทำการบันทึกข้อมูลในระบบแต่ละเดือน
- **ร้อยละ** คำนวณมาจากผลเปรียบเทียบกับแผนที่ผู้บันทึกทำการบันทึกในระบบแต่ละเดือน

2

โปรแกรมจะแสดงแผน ผล ร้อยละ ของแต่ละไตรมาส (4 ไตรมาส) โดย

- **แผนและผล** เป็นผลรวมจากข้อมูลแผนและผลที่ผู้บันทึกทำการบันทึกในระบบรวม 3 เดือน ได้แก่ ต.ค. – ธ.ค. / ม.ค. – มี.ค. / เม.ย. – มิ.ย. และ ก.ค. – ก.ย. รวมทั้งสิ้น 12 เดือน เป็น 4 ไตรมาส
- **ร้อยละ** คำนวณมาจากผลรวมของผลเทียบกับแผนของไตรมาส นั้น ๆ

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]																								
1																								
2																								
รายการ			ข้อความ		เอกสาร		เกินเวลา		ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ															
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน			ใหม่		ทั้งหมด		แนบ		(ครึ่ง)		งบจัดสรร		งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวมทั้งปี	
แผนงานยุทธศาสตร์																								
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม																								
3. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																								
3.1 กิจกรรม : สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ																								
3.1.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี																								
3.1.3 กิจกรรมขยายผลสู่เกษตรกร																								
3.1.4 เอกสารแนบ (รายงานผลการปฏิบัติงาน รายไตรมาส)																								
3.1.4 (1) สวพ.1 (เอกสาร)																								
3.1.4 (1.1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (เอกสาร)																								
3.1.4 (1.4) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินฯ ลุ่มน้ำแม่																								
3.1.4 (1.5) โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง บ้านขุนและ อ.จอมทอง																								
3.1.4 (1.6) โครงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง บ้านแมดงดิ่งอันเนื่องม																								
3.1.4 (1.7) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง																								
3.1.4 (1.8) โครงการบ้านแมกวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เ																								
3.1.4 (1.9) โครงการเกษตรวิชญ์บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม																								
3.1.4 (1.10) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น																								
3.1.4 (1.11) โครงการพัฒนามตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เช																								
3.1.4 (1.12) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราช																								

ไม่ใช่เมื่อนี้ ในปีงบประมาณ 2564
จึงไม่มีข้อมูลปรากฏในช่องนี้

ไม่ใช่เมนูนี้ ในปีงบประมาณ 2564
จึงไม่มีข้อมูลปรากฏในช่องนี้

1

ข้อความ แสดงจำนวนข้อความที่ผู้บันทึกทำการบันทึก เพื่อระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน หรือรายละเอียดผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าเพิ่มเติม เอกสารแนบ แสดงจำนวนไฟล์ข้อมูลที่ผู้บันทึกแนบผ่านตัวชี้วัดนั้น ๆ

เกินเวลา แสดงจำนวนการบันทึกเกินวันและเวลาที่ กทม. กำหนดไว้ในแต่ละเดือน

2

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เมนูนี้สำหรับแสดงผลการบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่าน กล่องเงิน แต่ในปีงบประมาณ 2564 ไม่ได้ให้ผู้บันทึกกรายงานแผน/ผลผ่านกล่องเงิน ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลปรากฏ อยู่ในช่องนี้

ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี							1	2
รายการ	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณภาพ	
แผนงานพื้นฐาน								
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน								
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร			31,929.00	32,416.00	115,738.15	357.04	5.00	ดีมาก
2.3 เอกสารแนบ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
2.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (ราย 6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
2.3.2(1) รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (6	แนบไฟล์			0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
2.3.2(2) รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (6	แนบไฟล์			0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
2.3.4 รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ (รายปี)	แนบไฟล์			0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับ			7,228.00	7,715.00	6,507.00	84.34	4.60	ดีมาก
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิต			965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผล			965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง
3-3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
3-3.2.1(1.33) คลินิกพืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง		145.00	145.00	22.00	15.17	1.34	ไม่ผ่าน
3-3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง		45.00	45.00	11.00	24.44	1.96	ปรับปรุงแก้ไข
3-3.2.1(1.27) วัตถุอันตราย (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง		40.00	40.00	10.00	25.00	2.00	ปรับปรุงแก้ไข
3-3.2.1(1.31) การวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยป่น (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง		80.00	80.00	30.00	37.50	2.50	ปานกลาง
3-3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง		40.00	40.00	18.00	45.00	2.80	ปานกลาง
3-3.2.1(1.10) ตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืช ดินแ	ตัวอย่าง		120.00	120.00	68.00	56.67	3.27	ปานกลาง
3-3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง		30.00	30.00	17.00	56.67	3.27	ปานกลาง
3-3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง		380.00	380.00	266.00	70.00	3.80	ดี

1

ระดับคุณภาพ คือ คำนวณมาจากเกณฑ์การให้คะแนนโดย กผง. ได้กำหนดเกณฑ์แต่ละระดับ ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน

โดย

ระดับที่ 1 = 10% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

- ค่าวิกฤต เป็นผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์

ระดับที่ 2 = 25% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

ระดับที่ 3

ระดับที่ 3 = 50% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

- ค่ายอมรับ เป็นผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์

ระดับที่ 4 = 75% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5 = 100% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

2

สีมิเตอร์	ช่วงระดับคุณภาพ	การอ่านค่าสีมิเตอร์
	N/A	ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือ ไม่เกี่ยวข้อง หรือ อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลสิ้นปีงบประมาณ
	1.00 – 1.49	ไม่ผ่าน
	1.50 – 2.49	ปรับปรุงแก้ไข
	2.50 – 3.49	ปานกลาง
	3.50 – 4.49	ดี
	4.50 – 5.00	ดีมาก

หมายเหตุ :

การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน กผง. จะกำหนดให้ทุกตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานแบบอัตโนมัติ เพื่อให้มีเกณฑ์เดียวกันทุกหน่วยงาน และลดภาระของหน่วยงานในการเข้าไปกำหนดเกณฑ์เอง

รายการ		ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี						
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน		หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณ...	
แผนงานพื้นฐาน								
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน								
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร			31,929.00	32,416.00	115,738.15	357.04	5.00	ดีมาก
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล พ.ร.บ.			7,228.00	7,715.00	6,507.00	84.34	4.60	ดีมาก
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร(ตัวอย่าง/ราย/ฉบับ)			965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรฯ			965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง
3-3.2.1(1.1.1) สุ่มตัวอย่างเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมจาก ครัวเรือนเกษตร(ตัวอย่าง)		ตัวอย่าง	80.00	80.00	57.00	71.25	3.85	ดี
3-3.2.1(1.10) ตรวจสอบสารพิษตก		ตัวอย่าง	120.00	120.00	68.00	56.67	3.27	ปานกลาง
3-3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง)		ดี			266.00	70.00	3.80	ดี
3-3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง)		ดี			17.00	56.67	3.27	ปานกลาง
3-3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง)		ดี			18.00	45.00	2.80	ปานกลาง
3-3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง)		ดี			11.00	24.44	1.96	ปรับปรุงแก้ไข
3-3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง)		ตัวอย่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์
3-3.2.1(1.27) รีดกลิ่นเตาย่าง (ตัวอย่าง)		ตัวอย่าง	40.00	40.00	10.00	25.00	2.00	ปรับปรุงแก้ไข
3-3.2.1(1.31) การวิเคราะห์ดินหิ		ตัวอย่าง	80.00	80.00	30.00	37.50	2.50	ปานกลาง
3-3.2.1(1.33) คลื่นวิทยุ (ตัวอย่าง)		ตัวอย่าง	145.00	145.00	22.00	15.17	1.34	ไม่ผ่าน
3.2.2 ใบรับรองสุขอนามัย*			3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00	ดีมาก
3.2.2.1 ใบรับรองสุขอนามัยผัก/ผลไม้			3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00	ดีมาก
3.2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรบ			2,825.00	2,825.00	2,156.00	76.32	4.05	ดีมาก
3.2.4.3 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช			1,040.00	1,040.00	1,025.00	98.56	4.94	ดีมาก
3.2.4.3(8) ออกหนังสือรับรองพันธุ์			1,040.00	1,040.00	1,025.00	98.56	4.94	ดีมาก
3.2.4.3(8.1) ออกใบอนุญาต ตาม			1,040.00	1,040.00	1,025.00	98.56	4.94	ดีมาก
3.2.4.5 พระราชบัญญัติปุ๋ย			985.00	985.00	622.00	63.15	3.53	ดีมาก
3.2.4.5(1) ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.			985.00	985.00	622.00	63.15	3.53	ดี
3.2.4.6 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย			800.00	800.00	509.00	63.63	3.54	ดีมาก
3.2.4.6(1) ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.			800.00	800.00	509.00	63.63	3.54	ดี
3.2.5 การตรวจรับ/สินค้าเกษตร			238.00	725.00	355.00	48.97	5.00	ดีมาก

เมื่อคลิกขวาตรงตัวชี้วัด
จะมีเมนูต่าง ๆ

เมื่อคลิกขวาตรงตัวชี้วัดจะมีเมนูต่างๆ ดังนี้


	ผลการปฏิบัติงาน
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)
	บันทึกข้อความ
	เกณฑ์การให้คะแนน
	รายงานการบันทึกข้อมูลเกินเวลาตามตัวชี้วัด
	รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต
	รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต
	รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด
	แสดงมีเตอร์สถานะผลงาน
	ยกเลิกแสดงมีเตอร์สถานะผลงาน
	แสดงมีเตอร์สถานะผลงานเต็มจอ
	ปิดหน้าต่างแสดงมีเตอร์สถานะผลงาน

ผลการปฏิบัติงาน : เป็นเมนูสำหรับบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน

ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ) : สามารถแนบข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น รายงานเชิงคุณภาพ (ตามแบบฟอร์ม) หลักฐานการโอนเงิน หนังสือขอปรับเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน เป็นต้น

บันทึกข้อความ : สามารถบันทึกข้อความเพื่อใส่หมายเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน

เกณฑ์การให้คะแนน : เมื่อตั้งค่าเกณฑ์แต่ละตัวชี้วัด หน่วยงานจะสามารถอ่านผลจากมีเตอร์ของโปรแกรมได้

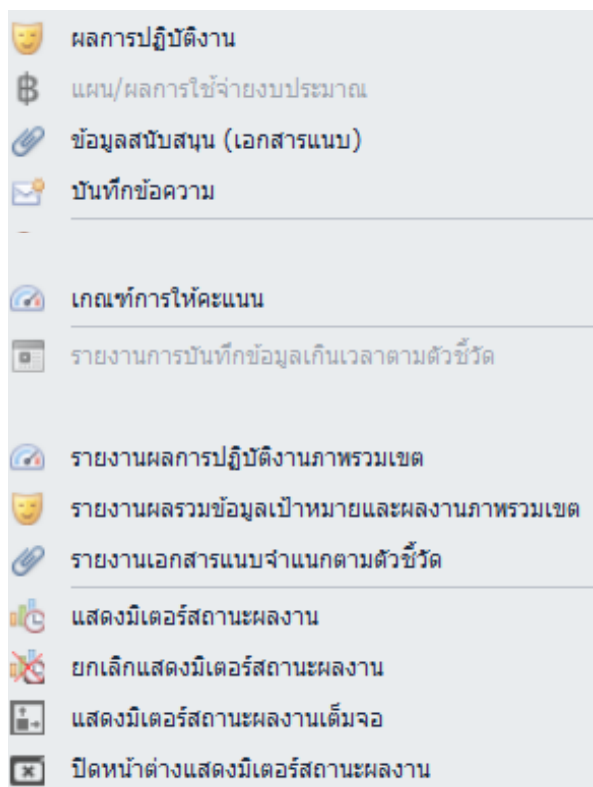

รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูค่าเกณฑ์ แผนจัดสรร การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน วัน/เวลาในการบันทึกข้อมูล ของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติตัวชี้วัดนั้น ๆ

รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูแผนจัดสรร แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน ร้อยละเมื่อเทียบผลรวมกับแผนจัดสรร และร้อยละผลรายไตรมาสเทียบกับแผนรายไตรมาส และร้อยละผลรายเดือนเทียบกับแผนรายเดือน

รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มรายงานที่ทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติในตัวชี้วัดนั้น ๆ แนบเข้ามา และสามารถกรองช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้

แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน : จะแสดงมิเตอร์ผลงานของตัวชี้วัดนั้น ๆ เมื่อเข้าในนามผู้บันทึกจะเห็นค่ามิเตอร์จากผลปฏิบัติงานเทียบกับแผนจัดสรรของตนเอง เมื่อเข้าในนามผู้รับรองจะเห็นค่ามิเตอร์ในภาพรวมจากผลปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเทียบกับแผนจัดสรรของทุกหน่วยงาน

ยกเลิกแสดงมิเตอร์สถานะผลงาน : กดเมื่อต้องการปิดการแสดงผลมิเตอร์สถานะผลงาน

1. เลือกเพิ่มโครงการที่ต้องการบันทึกข้อมูล แล้วเลือก “ตัวชี้วัด” ที่ต้องการ โดยรายงานข้อมูลตามหน่วยนับที่ระบุ
2. ใส่แผนการปฏิบัติงานหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่อง “แผน” และใส่ผลการปฏิบัติงานหรือผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่อง “ผล” ในช่องแต่ละเดือน โดยบันทึกผลเป็นรายเดือน โปรแกรมจะคำนวณผลรวมเป็นรายไตรมาส และรายปีให้อัตโนมัติ

3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรฯ(ตัวอย่าง/ราย/ฉบับ)

3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรฯ

3.3.2.1(1.1.1) สมตัวอย่างเผ่าร้างสายส่ง

3.3.2.1(1.10) ตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืช

3.3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง)

ผลการปฏิบัติงาน

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)

1. คลิกขวาตรงตัวชี้วัดที่ต้องการ

2. เลือกเมนู “ผลการปฏิบัติงาน”

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

เพิ่ม เครื่องมือ ช่วยเหลือ

ส่งออก รายงาน

แสดงวันสิ้นสุดของการบันทึกข้อมูลแต่ละเดือน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยนับ แผนจัดสรร แผนรวม ผลรวม ร้อยละ ระดับคุณ...

บันทึกเป้าหมาย/ผลงาน->3.-3.2.1(1.1) สมตัวอย่างเผ่าร้างสายส่ง (ตัวอย่าง)

เดือน, [วันที่สุดท้ายที่ใส่ข้อมูลได้] แผน ผล

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมทั้งปี

แสดงวันบันทึกค่าล่าสุดเสมอ

เดือน, [วันที่สุดท้ายที่ใส่ข้อมูลได้]	แผน	ผล
ตุลาคม[2/4/2564]	10.00	0.00
พฤศจิกายน[2/4/2564]	10.00	10.00
ธันวาคม[2/4/2564]	10.00	15.00
รวม	30.00	25.00
มกราคม[2/4/2564]	10.00	15.00
กุมภาพันธ์[2/4/2564]	10.00	17.00
มีนาคม[2/4/2564]	0.00	
รวม	20.00	32.00
รวมทั้งปี	80.00	57.00

ตั้งค่าเกณฑ์การให้คะแนน

บันทึก ยกเลิก

3. บันทึกแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในช่อง “แผน” ให้ครบ 12 เดือน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564

4. บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่อง “ผล” ของแต่ละเดือนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ดังนี้

4.1 ผลการปฏิบัติงาน ตัดยอดการรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน บันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 25 มีนาคม 2564 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564

ยกเว้น

- กิจกรรม : ตรวจแปลง GAP/ตรวจโรงงาน GMP และ กิจกรรม : ตรวจสอบอินทรีย์ ตัดยอดหลังจากเข้าคณะกรรมการรับรอง (CC) ของแต่ละเดือน แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

- การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง ตัดยอดทุกสิ้นเดือน แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยการรายงานครั้งแรก เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564

4.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตัดยอดการรายงาน ดังนี้

- หน่วยงานส่วนกลาง : ตัดยอดจากที่หน่วยงานนำไปสำคัญมาส่งที่กลุ่มเงินนอกงบประมาณ กกง. ในวันสุดท้ายของเดือน
- หน่วยงานส่วนภูมิภาค : ตัดยอดจากการวางเบิกในระบบ GF ในวันสุดท้ายของเดือน

5. บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด “บันทึก” ทันที

3. การรายงานแผน/ผลงาน กิจกรรม : อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้
ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร ปีงบประมาณ 2564

เนื่องจากกิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการรักษาให้คงอยู่ ดังนั้น
การกำหนดสูตรในโปรแกรมจะแตกต่างจากตัวชี้วัดในกิจกรรมอื่น ๆ โดย กผง. จะตั้งค่าในระบบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีแนวทางการบันทึกแผน/ผล ดังตัวอย่าง

- **ตัวอย่างที่ 1** การอนุรักษ์ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง จำนวน 6,000 สายพันธุ์ ต้องเปลี่ยน
อาหาร (re-culture) ทุก 3 เดือน เพราะฉะนั้น การบันทึกแผน/ผลงานในระบบ ต้องบันทึกตามรอบการ
เปลี่ยนอาหาร ดังตัวอย่างการบันทึก ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 1

ตัวชี้วัด : ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (สายพันธุ์) เป้าหมาย 6,000 สายพันธุ์

เดือน,[วันที่สุดท้ายที่ใส่ข้อมูลได้]	แผน	ผล	เดือน,[วันที่สุดท้ายที่ใส่ข้อมูลได้]	แผน	ผล
ไตรมาส 1			ไตรมาส 3		
ตุลาคม [ไม่กำหนดเวลา]	0	0	เมษายน [ไม่กำหนดเวลา]	0	0
พฤศจิกายน [ไม่กำหนดเวลา]	0	0	พฤษภาคม [ไม่กำหนดเวลา]	0	0
ธันวาคม [ไม่กำหนดเวลา]	6,000	6,000	มิถุนายน [ไม่กำหนดเวลา]	6,000	6,000
รวม	6,000	6,000	รวม	6,000	6,000
ไตรมาส 2			ไตรมาส 4		
มกราคม [ไม่กำหนดเวลา]	0	0	กรกฎาคม [ไม่กำหนดเวลา]	0	0
กุมภาพันธ์ [ไม่กำหนดเวลา]	0	0	สิงหาคม [ไม่กำหนดเวลา]	0	0
มีนาคม [ไม่กำหนดเวลา]	6,000	6,000	กันยายน [ไม่กำหนดเวลา]	6,000	6,000
รวม	50	50	รวม	6,000	6,000
			รวมทั้งปี	รวม	6,000
				6,000	6,000

บันทึก

ยกเลิก

- ตัวอย่างที่ 2 การอนุรักษ์พันธุ์พืชไว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์ เช่น ทุเรียน จำนวน 50 สายพันธุ์ ต้องดูแลรักษาเป็นประจำทุกเดือน เพราะฉะนั้น การบันทึกแผน/ผลงานในระบบ ต้องบันทึกตามจำนวนที่อนุรักษ์ได้ทุกเดือน คือ 50 สายพันธุ์ ดังตัวอย่างการบันทึก ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 2

ตัวชี้วัด : ทุเรียน(สายพันธุ์) เป้าหมาย 50 สายพันธุ์

เดือน,[วันที่สุดท้ายที่ใส่ข้อมูลได้]	แผน	ผล	เดือน,[วันที่สุดท้ายที่ใส่ข้อมูลได้]	แผน	ผล
ไตรมาส 1			ไตรมาส 3		
ตุลาคม [ไม่กำหนดเวลา]	50	50	เมษายน [ไม่กำหนดเวลา]	50	50
พฤศจิกายน [ไม่กำหนดเวลา]	50	50	พฤษภาคม [ไม่กำหนดเวลา]	50	50
ธันวาคม [ไม่กำหนดเวลา]	50	50	มิถุนายน [ไม่กำหนดเวลา]	50	50
รวม	50	50	รวม	50	50
ไตรมาส 2			ไตรมาส 4		
มกราคม [ไม่กำหนดเวลา]	50	50	กรกฎาคม [ไม่กำหนดเวลา]	50	50
กุมภาพันธ์ [ไม่กำหนดเวลา]	50	50	สิงหาคม [ไม่กำหนดเวลา]	50	50
มีนาคม [ไม่กำหนดเวลา]	50	50	กันยายน [ไม่กำหนดเวลา]	50	50
รวม	50	50	รวม	50	50
			รวมทั้งปี		
			รวม	50	50

หมายเหตุ :

- หากมีผู้บันทึกหลายคนเข้าใช้งานโปรแกรมด้วยรหัสผู้ใช้เดียวกัน โปรแกรมจะแสดงผลข้อมูลวันและเวลาที่บันทึกข้อมูลล่าสุดเสมอ
- หากมีการแก้ไขข้อมูลเกินเวลาที่กำหนด โปรแกรมจะแสดงจำนวนครั้งที่บันทึกเกินเวลา
- เมื่อผู้บันทึกบันทึกข้อมูลแล้วโปรแกรมจะประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัดให้อัตโนมัติ
- เมื่อบันทึกข้อมูล และใช้งานโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าจอทันที เพื่อป้องกันหน้าจอค้างในขณะที่ยังไม่ได้กดบันทึก

1 คลิกขวา เลือกเมนู “แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน” ของตัวชี้วัดที่ต้องการ


2 โปรแกรมจะแสดงสถานะมิเตอร์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานตามระดับของเกณฑ์การให้คะแนน โดย กผง. ตั้งไว้ให้แล้ว ในทุกตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานซึ่งโปรแกรมจะประมวลผลอัตโนมัติทุกวันในเวลา 03.00 น.

และสามารถ





- เลือกดูผลมิเตอร์แต่ละไตรมาสได้ (Q1/Q2/Q3/Q4) โดยโปรแกรมจะแสดงสถานะมิเตอร์คำนวณจากการเทียบผล ณ ไตรมาสนั้นกับแผนจัดสรร ดังรูป เลือกไตรมาสที่ 1 ดำเนินการได้ 25 ตัวอย่างอยู่ในช่วงเกณฑ์ระดับที่ 2 – 3 เมื่อเทียบกับแผนจัดสรร



- เลือกดูผลมิเตอร์ในรูปแบบกราฟได้ โดยโปรแกรมจะแสดงแผน/ผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

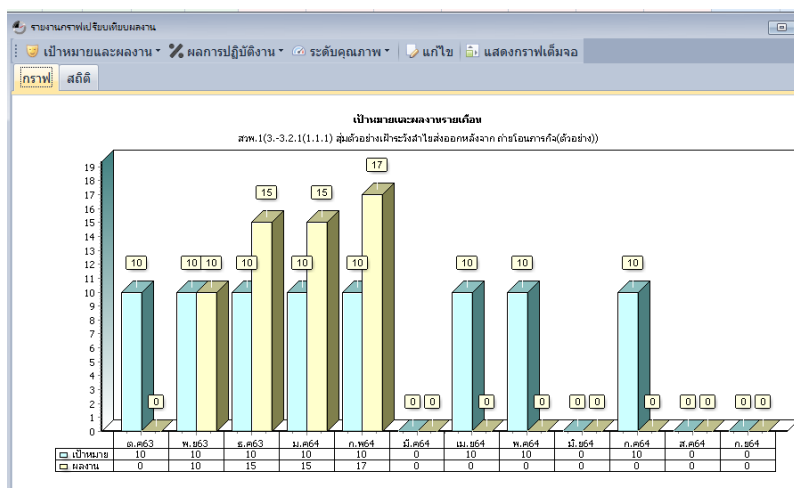



เป็นการเพิ่มรายละเอียดของข้อมูล หรือรูปภาพในแต่ละกิจกรรม หรือ บันทึกปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน รวมทั้งกรณีที่ใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในรูปแบบการแนบไฟล์ และ/หรือ การบันทึกเพิ่มเติมโดยเลือกผลิต/โครงการ ที่ต้องการแนบข้อมูลสนับสนุน แล้วเลือกตัวชี้วัด ภายใต้หัวข้อ หรือ ตัวชี้วัดชื่อ “เอกสารแนบ”

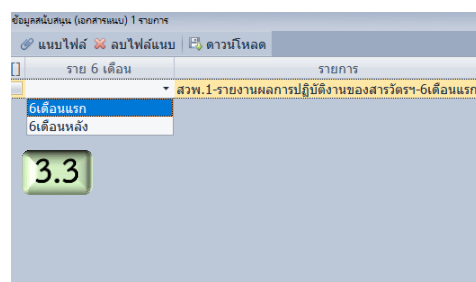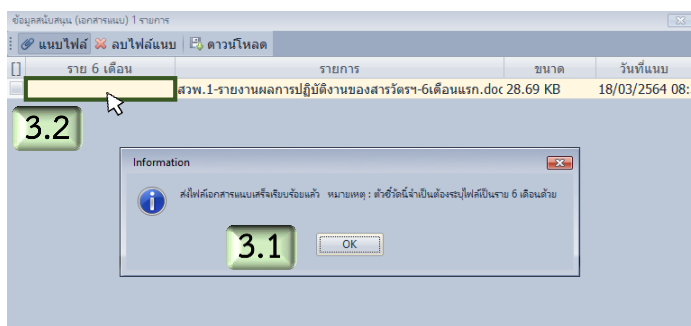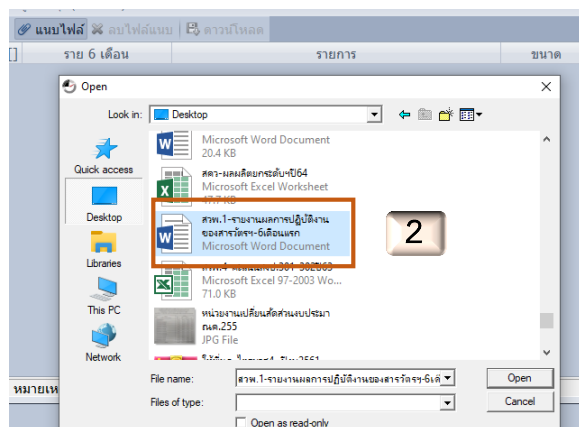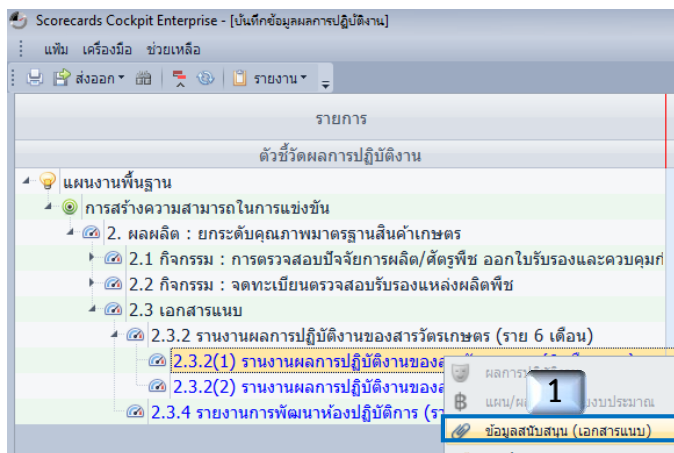

1. คลิกขวาตัวชี้วัดที่ต้องการแนบเอกสาร เลือก “ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)”
2. คลิกตรง “แนบไฟล์” แล้วเลือกไฟล์รายงานที่ต้องการ
3. 3.1 เมื่อเลือกไฟล์รายงานที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะแจ้งให้ระบุ “รอบการส่งรายงาน” ว่าเป็นรายงานรอบใด ให้คลิก “OK”
3.2 แล้วนำเคอร์เซอร์ไปคลิกตรงช่องว่างภายในสี่เหลี่ยม จะปรากฏ “▼”
3.3 คลิกตรง “▼” จะปรากฏรอบการส่งรายงาน ให้เลือกรอบการส่งรายงานที่ต้องการ

6. การบันทึกข้อมูลในเมนูข้อความ

เป็นการเพิ่มรายละเอียดของข้อมูล เพื่อระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน หรือรายละเอียดผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าเพิ่มเติม



1. คลิกขวาตัวชี้วัดที่ต้องการเพิ่มข้อความเลือก “บันทึกข้อความ”
2. คลิกตรง “เพิ่มข้อความใหม่” แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการแจ้งให้ กผง. หรือ ผู้รับรองของเขตทราบ

การดูรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน เมื่อบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน ในหน้าจอเริ่มต้น จะปรากฏข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นรายเดือน ผลรวมรายไตรมาส และผลรวมสรุปทั้งปี และสามารถส่งออกในรูปแบบไฟล์ Excel โดยสามารถปรับแต่ง หรือเลือกข้อมูลเพื่อรายงานผลได้เลย

คลิกเมนู “ส่งออก” แล้วเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการ

รายการ	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณ...
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		31,929.00	32,416.00	115,738.15	357.04	5.00 ดีมาก
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบร		7,228.00	7,715.00	6,507.00	84.34	4.60 ดีมาก
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07 ปานกลาง
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07 ปานกลาง
3.2.1(1.1) สุ่มตัวอย่างเฝ้าระวังสายส่งออก	ตัวอย่าง	80.00	80.00	57.00	71.25	3.85 ดี
3.2.1(1.10) ตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืช ดิน	ตัวอย่าง	120.00	120.00	68.00	56.67	3.27 ปานกลาง
3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	380.00	380.00	266.00	70.00	3.80 ดี
3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	30.00	30.00	17.00	56.67	3.27 ปานกลาง
3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	40.00	40.00	18.00	45.00	2.80 ปานกลาง
3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	45.00	45.00	11.00	24.44	1.96 ปรับปรุงแก้ไข
3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 ต่ำกว่าเกณฑ์
3.2.1(1.27) วัตถุอันตราย (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	40.00	40.00	10.00	25.00	2.00 ปรับปรุงแก้ไข
3.2.1(1.31) การวิเคราะห์ดินหรือพืชเป็นเอน (ตัว	ตัวอย่าง	80.00	80.00	30.00	37.50	2.50 ปานกลาง
3.2.1(1.33) คลินิกพืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	145.00	145.00	22.00	15.17	1.34 ไม่ผ่าน
3.2.2 ไม่รับรองสุขอนามัย*		3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00 ดีมาก
3.2.2.1 ไม่รับรองสุขอนามัยผัก/ผลไม้ส่งออก*	ฉบับ	3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00 ดีมาก
3.2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรบ.		2,825.00	2,825.00	2,156.00	76.32	4.05 ดีมาก


ตัวอย่างรายงานที่ส่งออกในรูปแบบไฟล์นามสกุล Excel

บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน [Compatibility Mode] - Excel												
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help ACROBAT Tell me what you want to do												
Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing												
A1 X Y Z AA AB AC AD AE AF												
รายการ												
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน												
หน่วยนับ แผนจัดสรร แผนรวม ผลรวม ร้อยละ ระดับ												
ตาม ผล ร้อยละ												
-	แผนงานพื้นฐาน											
-	การสร้างความสามารถในการแข่งขัน											
-	2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		31,929.00	32,416.00	115,738.15	357.04	5 ดีมาก	9,684.00	13,742.34	141.91		
-	2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออก		7,228.00	7,715.00	6,507.00	84.34	4.6 ดีมาก	318	350	110.06		
-	3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์		965	965	499	51.71	3.07 ปานกลาง	115	45	39.13		
-	3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์		965	965	499	51.71	3.07 ปานกลาง	115	45	39.13		
-	3.2.1(1.1) สุ่มตัวอย่างเฝ้าระวังสายส่งออก	ตัวอย่าง	80	80	57	71.25	3.85 ดี	10	0	0		
-	3.2.1(1.10) ตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืช	ตัวอย่าง	120	120	68	56.67	3.27 ปานกลาง	17	7	41.18		
-	3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	380	380	266	70	3.8 ดี	42	26	61.9		
-	3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	30	30	17	56.67	3.27 ปานกลาง	3	0	0		
-	3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	40	40	18	45	2.8 ปานกลาง	5	1	20		
-	3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	45	45	11	24.44	1.96 ปรับปรุงแก้ไข	5	5	100		
-	3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	5	5	0	0	0 ต่ำกว่าเกณฑ์	1	0	0		
-	3.2.1(1.27) วัตถุอันตราย (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	40	40	10	25	2 ปรับปรุงแก้ไข	5	0	0		
-	3.2.1(1.31) การวิเคราะห์ดินหรือพืชเป็นเอน	ตัวอย่าง	80	80	30	37.5	2.5 ปานกลาง	10	0	0		
-	3.2.1(1.33) คลินิกพืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	145	145	22	15.17	1.34 ไม่ผ่าน	17	6	35.29		
-	3.2.2 ไม่รับรองสุขอนามัย*		3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5 ดีมาก	5	54	1,080.00		
-	3.2.2.1 ไม่รับรองสุขอนามัยผัก/ผลไม้ส่งออก*	ฉบับ	3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5 ดีมาก	5	54	1,080.00		
-	3.2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรบ.		2,825.00	2,825.00	2,156.00	76.32	4.05 ดีมาก	153	251	164.05		
-	3.2.4.3 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช		1,040.00	1,040.00	1,025.00	98.56	4.94 ดีมาก	5	15	300		
-	3.2.4.3(8) ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชตาม		1,040.00	1,040.00	1,025.00	98.56	4.94 ดีมาก	5	15	300		
-	3.2.4.3(8.1) ออกใบอนุญาต ตามใบอนุญาต	ฉบับ	1,040.00	1,040.00	1,025.00	98.56	4.94 ดีมาก	5	15	300		
-	3.2.4.5 พระราชบัญญัติพืช		985	985	622	63.15	3.53 ดีมาก	82	132	160.98		
-	3.2.4.5(1) ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.พืช	ฉบับ	985	985	622	63.15	3.53 ดี	82	132	160.98		

8. การเรียกดูรายงานอื่น ๆ ได้แก่

- จำนวนการบันทึกผลการปฏิบัติงาน

21

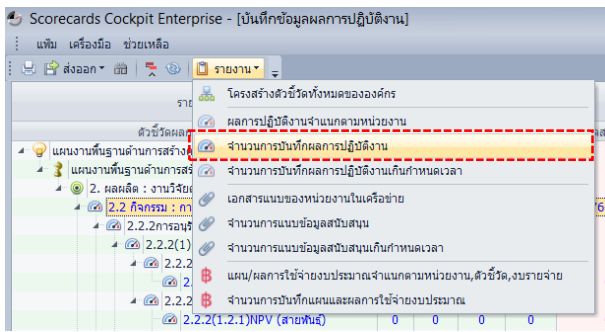

รายงานจำนวนการบันทึกผลการปฏิบัติงานตามจำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ส่งออก

จำเป็นต้องบันทึกครบ 12 เดือน ทั้งช่องแผนและผล สำหรับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ดังนี้

- 1.บันทึกผลการปฏิบัติงานเท่านั้น
- 2.บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- 3.บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแบบเอกสาร
- 4.บันทึกผลการปฏิบัติงาน, แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแบบเอกสาร

วิธีการคิดคะแนน

- 1. คะแนนผลการบันทึกแผน = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องแผนครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- 2. คะแนนผลการบันทึกผล = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องผลครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด
- 3. คะแนนผลการบันทึกแผนและผล = (จำนวนตัวชี้วัดที่มีการบันทึกในช่องแผนและผลครบทั้ง 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด

รายการ	1	2	3	4	5						
	จำนวนตัวชี้วัด	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	แผนและผล	ค.ด.
หน่วยงาน	จำนวนตัวชี้วัด	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	บันทึกตัวชี้วัดครบ	คะแนน	แผนและผล	ค.ด.
สวพ.1	60	60	5	0	0	0	0	60	60		


1 จำนวนตัวชี้วัด แสดงจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติงาน

2 บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องแผน) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องแผน) แสดงผลคะแนนของการบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน

3 บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องผล) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องผล) แสดงผลคะแนนของการบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน

4 บันทึกตัวชี้วัดครบ (ในช่องแผนและผล) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
คะแนน (ในช่องแผนและผล) แสดงผลคะแนนของการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานได้ครบตามวิธีการคิดคะแนน

5 แผน (ในเดือนตุลาคม) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกแผนการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน
ผล (ในเดือนตุลาคม) แสดงจำนวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ครบ 12 เดือน

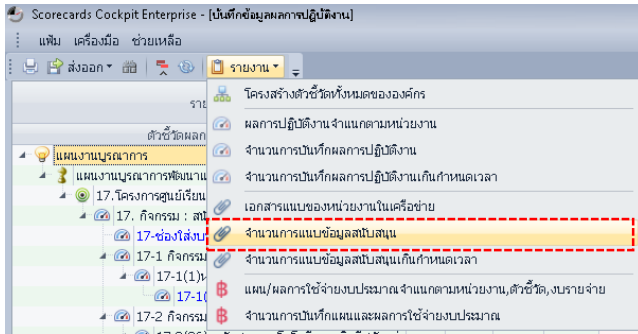

รายงานจำนวนการแนบข้อมูลสนับสนุนตามจำนวนตัวชี้วัดที่กำหนดให้

แสดงเอกสารแนบ

ส่งออก

จำเป็นต้องบันทึกครบตามช่วงเวลาที่กำหนดให้เป็นรายเดือน, ไตรมาส, รอบ 6 เดือน, รายปี สำหรับตัวชี้วัดที่กำหนดดังนี้

1. สำหรับแบบเอกสารเท่านั้น

2. บันทึกผลการปฏิบัติงาน และแบบเอกสาร

3. บันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแบบเอกสาร

4. บันทึกผลการปฏิบัติงาน, แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแบบเอกสาร

วิธีการคิดคะแนน

1. คะแนนผลการแนบเอกสารรายไตรมาส = (จำนวนตัวชี้วัดแบบครบทั้ง 4 ไตรมาส x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด

2. คะแนนผลการแนบเอกสารรายเดือน = (จำนวนตัวชี้วัดแบบครบ 12 เดือน x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด

3. คะแนนผลการแนบเอกสารราย 6 เดือน = (จำนวนตัวชี้วัดแบบครบทั้ง 6 เดือน แรกและ 6 เดือนหลัง x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด

4. คะแนนผลการแนบเอกสารรายปี = (จำนวนตัวชี้วัดแบบครบรายปี x 5) / จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่กำหนด

5. คะแนนเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด


รายการ	หน่วยงาน	คะแนนรวม	คะแนนที่ได้	รอบ 6 เดือน			รายปี			
				จำนวนตัวชี้วัดกำหนด	จำนวนตัวชี้วัดแบบครบ	คะแนนที่ได้	จำนวนตัวชี้วัดกำหนด	จำนวนตัวชี้วัดแบบครบ	คะแนนที่ได้	
ศ.ม. ลพบุรี		0.00	0	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00

1 จำนวนตัวชี้วัดที่กำหนด แสดงจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานรับผิดชอบแนบบรรายงานภายใต้ผลผลิต/โครงการนั้น

2 จำนวนตัวชี้วัดแบบครบ แสดงจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดที่หน่วยงานแนบบรรายงานได้ครบตามรอบเวลา

3 คะแนนที่ได้ แสดงคะแนนที่ได้จากการแนบบรรายงานครบตามรอบเวลาและเงื่อนไขของวิธีการคิดคะแนน

9.2.1 ส่วนประกอบของหน้าจอเริ่มต้น

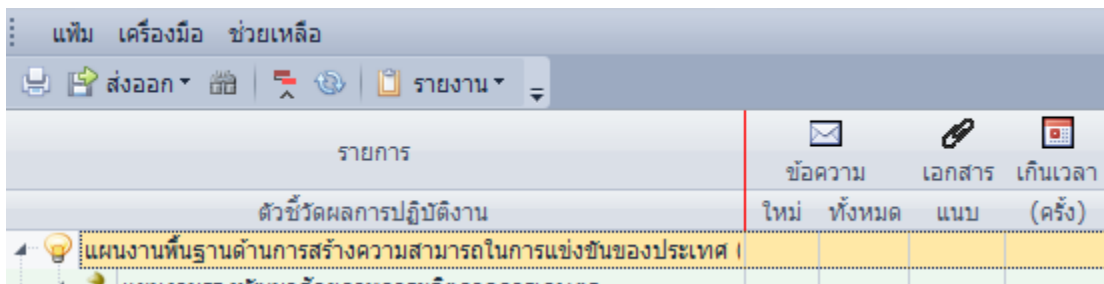


ส่งออก : สามารถส่งออกข้อมูลในหน้าจอเริ่มต้นและในหน้ารายงานต่าง ๆ เป็นไฟล์นามสกุลอื่นได้ เช่น Excel



ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ : เป็นทางลัดในการค้นหากิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องการ



ย่อโครงสร้าง : ย่อ/ขยายโครงสร้างแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

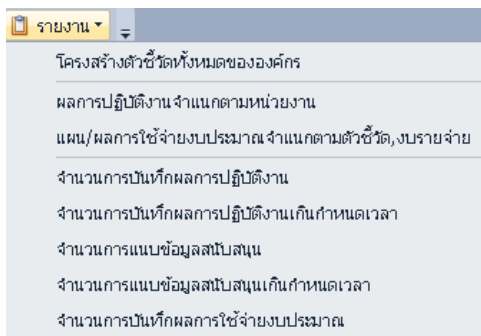

รายงาน : ผู้บันทึกสามารถเรียกดูรายงานของหน่วยงานตนเอง และผู้รับรองสามารถเรียกดูรายงานภาพรวมของหน่วยงานภายใต้สังกัดได้จากเมนูนี้



ข้อความ : แสดงจำนวนข้อความที่ผู้บันทึกทำการบันทึก เพื่อระบุปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน หรือรายละเอียดผลการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าเพิ่มเติม



เอกสารแนบ : แสดงจำนวนไฟล์ข้อมูลที่ผู้บันทึกแนบผ่านตัวชี้วัดนั้น ๆ

2 หน่วยนับ คือ สำหรับระบุหน่วยนับที่สอดคล้องกับกิจกรรม/ตัวชี้วัดที่ต้องบันทึก หรือแนบไฟล์ข้อมูล
แผนจัดสรร คือ ผลรวมของค่าเป้าหมายและจำนวนงบประมาณที่กรมจัดสรรให้ทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้
 สังกัดของผู้รับรอง ซึ่งรับผิดชอบตัวชี้วัดนั้น ๆ

ร้อยละ (ภายใต้หัวข้อผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี) คำนวณมาจากผลรวมการปฏิบัติงานหรือผลรวมการใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับผลรวมแผนจัดสรร

ตัวอักษรสีดำ คือ ผลรวมของข้อมูลที่อยู่ภายใต้หัวข้อนั้น ๆ ซึ่งได้มาจากการกำหนดสูตรของ กผง.โดยโปรแกรมจะแสดงข้อมูลอัปเดตหลังจากประมวลผลภาพรวมระดับกรมเท่านั้น

หมายเหตุ : โปรแกรมจะทำการประมวลผลข้อมูลภาพรวมระดับกรม ทุกวัน เวลา 03.00 น.

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]												
1												
2												
รายการ			ไตรมาส 1						รวมไตรมาส1			
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน			ไตรมาส 1		ไตรมาส 1		ไตรมาส 1		ไตรมาส 1		รวมไตรมาส1	
			แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	รวมไตรมาส1
แผนงานพื้นฐาน												
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน												
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร												
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบ												
2.2 กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช												
2.2.1 แหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรองรับมาตรฐาน												
2.2.1.1 ตรวจแปลง GAP พืช (แปลง)												
2.2.1.1(1) ตรวจติดตาม GAP พืช												
2.2.1.1(2) ตรวจตัวอย่าง GAP พืช												
2.2.1.1(3) ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q GAP พืช												
2.2.1.2 ตรวจแปลง GAP พืช (ราย)												
2.2.1.2(1) ตรวจติดตาม GAP พืช												
2.2.1.2(2) ตรวจตัวอย่าง GAP พืช												
2.2.1.2(3) ตรวจแปลงยังไม่ได้ Q GAP พืช												
2.2.1.3 ตรวจแปลง GAP พืช (ไร่)												
2.2.1.4 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (แปลง)												
2.2.1.5 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (ราย)												
2.2.1.6 แปลง GAP พืช ที่ผ่านการรับรอง (ไร่)												
2.2.2 สุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ สุ่มตัวอย่าง monitor / ต												
2.2.6 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ												
2.3 เอกสารแนบ												
2.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวิเคราะห์ (ราย)												
2.3.4 รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ (รายปี)												

1

โปรแกรมจะแสดงแผน ผล ร้อยละ ของทุกเดือน (12 เดือน) โดย

- **แผนและผล** เป็นผลรวมของข้อมูลที่ผู้บันทึกของทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรอง มีแผนปฏิบัติทำการบันทึกข้อมูลในระบบแต่ละเดือน
- **ร้อยละ** คำนวณมาจากผลรวมเปรียบเทียบกับแผนรวมของเดือนนั้น ๆ

2

โปรแกรมจะแสดงแผน ผล ร้อยละ ของแต่ละไตรมาส (4 ไตรมาส) โดย

- **แผนและผล** เป็นผลรวมจากข้อมูลแผนและผลที่ผู้บันทึกของทุกศูนย์ที่เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรองทำการบันทึกในระบบรวม 3 เดือน ได้แก่ ต.ค. – ธ.ค. / ม.ค. – มี.ค. / เม.ย. – มิ.ย. และ ก.ค. – ก.ย. รวมทั้งสิ้น 12 เดือน เป็น 4 ไตรมาส
- **ร้อยละ** คำนวณมาจากผลรวมของผลเทียบกับผลรวมของแผนของไตรมาสนั้น ๆ

ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี							1	2
รายการ	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณภาพ		
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน								
แผนงานพื้นฐาน								
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		55,320.00	68,519.26	163,776.05	239.02	5.00	ดีมาก	
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออก		10,885.00	11,518.00	9,846.00	85.48	4.62	ดีมาก	
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผล		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง	
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง	
3.3.2.1(1.1.1) สุ่มตัวอย่างเฝ้าระวังสารใบสอ	ตัวอย่าง	80.00	80.00	57.00	71.25	3.85	ดี	
3.3.2.1(1.10) ตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืช	ตัวอย่าง	120.00	120.00	68.00	56.67	3.27	ปานกลาง	
3.3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	380.00	380.00	266.00	70.00	3.80	ดี	
3.3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	30.00	30.00	17.00	56.67	3.27	ปานกลาง	
3.3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	40.00	40.00	18.00	45.00	2.80	ปานกลาง	
3.3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	45.00	45.00	11.00	24.44	1.96	ปรับปรุงแก้ไข	
3.3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์	
3.3.2.1(1.27) วัตถุอันตราย (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	40.00	40.00	10.00	25.00	2.00	ปรับปรุงแก้ไข	
3.3.2.1(1.31) การวิเคราะห์ดินร่วนปนเปื้อน	ตัวอย่าง	80.00	80.00	30.00	37.50	2.50	ปานกลาง	
3.3.2.1(1.33) คลื่นไฟฟ้า (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	145.00	145.00	22.00	15.17	1.34	ไม่ผ่าน	
3.2.2 ใบรับรองสุขอนามัย*		3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00	ดีมาก	
3.2.2.1 ใบรับรองสุขอนามัยผัก/ผลไม้ส่งออก*	ฉบับ	3,200.00	3,200.00	3,497.00	109.28	5.00	ดีมาก	
3.2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรบ.		6,300.00	5,745.00	5,261.00	91.58	4.34	ดีมาก	

1

ระดับคุณภาพ คือ คำนวณมาจากเกณฑ์การให้คะแนนโดย กผง. ได้กำหนดเกณฑ์แต่ละระดับ ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน

โดย

ระดับที่ 1 = 10% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

- ค่าวิกฤต เป็นผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์
ระดับที่ 3

ระดับที่ 2 = 25% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

- ค่ายอมรับ เป็นผลการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงเกณฑ์
ระดับที่ 4

ระดับที่ 3 = 50% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

ระดับที่ 4 = 75% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

ระดับที่ 5 = 100% ของค่าเป้าหมายทั้งปี

2

สีมิเตอร์	ช่วงระดับคุณภาพ	การอ่านค่าสีมิเตอร์
	N/A	ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือ ไม่เกี่ยวข้อง หรือ อยู่ ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลสิ้นปีงบประมาณ
	1.00 – 1.49	ไม่ผ่าน
	1.50 – 2.49	ปรับปรุงแก้ไข
	2.50 – 3.49	ปานกลาง
	3.50 – 4.49	ดี
	4.50 – 5.00	ดีมาก

หมายเหตุ :

การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน กผง. จะกำหนดให้ทุกตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานแบบอัตโนมัติ
เพื่อให้มีเกณฑ์เดียวกันทุกหน่วยงาน และลดภาระของหน่วยงานในการเข้าไปกำหนดเกณฑ์เอง

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

เพิ่ม เครื่องมือ ช่วยเหลือ

ส่งออก ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก รายงาน

รายการ		ผลการดำเนินงานสรุปทั้งปี					
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณ...	
แผนงานพื้นฐาน							
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน							
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		55,320.00	68,519.26	163,776.05	239.02	5.00	ดีมาก
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรอง		10,885.00	11,518.00	9,846.00	85.48	4.62	ดีมาก
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร		965.00	965.00	499.00	51.71	3.07	ปานกลาง
3.2.1(1.1) ผลการปฏิบัติงาน		80.00	80.00	57.00	71.25	3.85	ดี
3.2.1(1.10) แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				68.00	56.67	3.27	ปานกลาง
3.2.1(1.12) ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)				266.00	70.00	3.80	ดี
3.2.1(1.13) บันทึกข้อความ				17.00	56.67	3.27	ปานกลาง
3.2.1(1.14) โครงการ/กิจกรรม				18.00	45.00	2.80	ปานกลาง
3.2.1(1.16) โครงการ/กิจกรรม		45.00	45.00	11.00	24.44	1.96	ปรับปรุงแก้ไข
3.2.1(1.17) โครงการ/กิจกรรม		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	ต่ำกว่าเกณฑ์

เมื่อคลิกขวาตรงตัวชี้วัด จะมีเมนูต่าง ๆ

เมื่อคลิกขวาตรงตัวชี้วัดจะมีเมนูต่าง ๆ โดยมีเมนูที่เกี่ยวข้องในการดูข้อมูลของผู้รับรอง ดังนี้

ผลการปฏิบัติงาน
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลสนับสนุน (เอกสารแนบ)
บันทึกข้อความ
โครงการ/กิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
รายงานการบันทึกข้อมูลเกินเวลาตามตัวชี้วัด
รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมเขต
รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต
รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต
รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด
แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน
ยกเลิกแสดงมิเตอร์สถานะผลงาน
แสดงมิเตอร์สถานะผลงานเต็มจอ
ปิดหน้าต่างแสดงมิเตอร์สถานะผลงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูค่าเกณฑ์ แผนจัดสรร การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน วัน/เวลาในการบันทึกข้อมูล ของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติตัวชี้วัดนั้น ๆ

รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูแผนจัดสรร แผน/ผลกาปฏิบัติงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน ร้อยละเมื่อเทียบผลรวมกับแผนจัดสรร และร้อยละผลรายไตรมาสเทียบกับแผนรายไตรมาส และร้อยละผลรายเดือนเทียบกับแผนรายเดือน

รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด : เป็นเมนูสำหรับผู้รับรอง เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มรายงานที่ทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติในตัวชี้วัดนั้น ๆ แนบเข้ามา และสามารถกรองช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้

แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน : จะแสดงมิเตอร์ผลงานของตัวชี้วัดนั้น ๆ เมื่อเข้าในนามผู้บันทึกจะเห็นค่ามิเตอร์จากผลปฏิบัติงานเทียบกับแผนจัดสรรของตนเอง เมื่อเข้าในนามผู้รับรองจะเห็นค่ามิเตอร์ในภาพรวมจากผลปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเทียบกับแผนจัดสรรของทุกหน่วยงาน

ยกเลิกแสดงมิเตอร์สถานะผลงาน : กดเมื่อต้องการปิดการแสดงผลมิเตอร์สถานะผลงาน

1. รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต เพื่อดูค่าเกณฑ์ แผนจัดสรร การบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายปี/รายไตรมาส/รายเดือน วัน/เวลาในการบันทึกข้อมูลของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติตัวชี้วัดนั้น ๆ

Scorecards Cockpit Enterprise - [บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน]

เมนู: เครื่องมือ > รายงาน

รายการ	ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผน
แผนงานพื้นฐาน				
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		55,320.00	6	
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรอง		10,885.00	5	
2.2 กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช		44,435.00	5	
2.2.1 แหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรองรับมาตรฐานตาม:		42,600.00	5	
2.2.1.1 ตรวจสอบ GAP พืช (แปลง)			3	
2.2.1.1(1) ตรวจสอบตาม GAP พืช				
2.2.1.1(2) ตรวจสอบด้วย GAP พืช				
2.2.1.1(3) ตรวจสอบยังไม่ได้ Q				
2.2.1.2 ตรวจสอบ GAP พืช (ราย)				
2.2.1.3 ตรวจสอบ GAP พืช (ไร่)				
รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต				
รายงานผลรวมข้อมูลเป้าหมายและผลงานภาพรวมเขต				
รายงานเอกสารแนบงานตามตัวชี้วัด				
แสดงมีเดียมสถานะผลงาน				

1. คลิกขวาตัวชี้วัดที่ต้องการ
2. เลือก “รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขต”

รายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมเขตภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก

1

2.2.1.1(1) ตรวจสอบตาม GAP พืช

รายการ	หน่วยงาน	น้ำหนัก	เกณฑ์ 1	เกณฑ์ 2	เกณฑ์ 3	เกณฑ์ 4	เกณฑ์ 5	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผล
สวพ.1(ผู้รับรอง)		1.00	800.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	642.00
สวพ.1		1.00	320.00	800.00	1,600.00	2,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	464.00
สวพ.กส.เขียงราย		1.00	100.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	92.00
สวพ.แม่ฮ่องสอน		1.00	30.00	75.00	150.00	225.00	300.00	300.00	300.00	28.00
สวพ.เขียงใหม่		1.00	100.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5.00
สวพ.ลำปาง		1.00	70.00	175.00	350.00	525.00	700.00	700.00	700.00	1.00
สวพ.แพร่		1.00	80.00	200.00	400.00	600.00	800.00	800.00	800.00	52.00
สวพ.น่าน		1.00	100.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

2

2.2.1.1(1) ตรวจสอบตาม GAP พืช

รายการ	หน่วยงาน	แผน	เวลาบันทึก	ผล	เวลาบันทึก	ระดับ	แผน	เวลาบันทึก	ผล	เวลาบันทึก	ระดับ
สวพ.1(ผู้รับรอง)		1,289.00		0.00		0.00	1,058.00		0.00		0.00
สวพ.1		131.00	03/02/2564 11:01	0.00	29/01/2564 14:39	0.00	0.00	03/02/2564 11:01:11	0.00	29/01/2564 14:39:23	0.00
สวพ.กส.เขียงราย		0.00	22/01/2564 15:19	0.00	22/01/2564 15:19	0.00	1,000.00	22/01/2564 15:19:24	0.00	26/01/2564 15:54:39	0.00
สวพ.แม่ฮ่องสอน		50.00	25/01/2564 14:58	0.00	25/01/2564 14:58	0.00	0.00	25/01/2564 14:58:46	0.00	25/01/2564 14:58:46	0.00
สวพ.เขียงใหม่		250.00	28/01/2564 09:49	0.00	28/01/2564 09:49	0.00	0.00	28/01/2564 09:49:25	0.00	28/01/2564 09:49:25	0.00
สวพ.ลำปาง		58.00	28/01/2564 10:49	0.00	28/01/2564 10:49	0.00	58.00	28/01/2564 10:49:10	0.00	28/01/2564 10:49:10	0.00
สวพ.แพร่		800.00	26/01/2564 15:01	0.00	26/01/2564 15:01	0.00	0.00	26/01/2564 15:01:11	0.00	26/01/2564 15:01:11	0.00
สวพ.น่าน											

3

2.2.1.1(1) ตรวจสอบตาม GAP พืช


รายการ	หน่วยงาน	แผน	ผล	ระดับ
สวพ.1(ผู้รับรอง)		2,405.00	158.00	0.00
สวพ.1		131.00	131.00	0.00
สวพ.กส.เขียงราย		1,000.00	16.00	0.00
สวพ.แม่ฮ่องสอน		50.00	11.00	0.00
สวพ.เขียงใหม่		250.00	0.00	0.00
สวพ.ลำปาง		174.00	0.00	0.00
สวพ.แพร่		800.00	0.00	0.00
สวพ.น่าน		0.00	0.00	0.00

1 แสดงค่าเกณฑ์ แผนจัดสรร ผลรวมการบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทั้งปีของทุกหน่วยงานภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก


2 แสดงแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ วัน/เวลาในการบันทึกข้อมูล ของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก

3 แสดงแผนรวม/ผลรวมการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ของทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติ ภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก โดยระดับคุณภาพเกิดจากการเปรียบเทียบผล ณ ไตรมาสนั้น ๆ กับแผนจัดสรร

3. รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์ม รายงาน ที่ทุกหน่วยงานที่มีแผนปฏิบัติในตัวชี้วัดนั้น ๆ แนบเข้ามา และสามารถกรองช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้

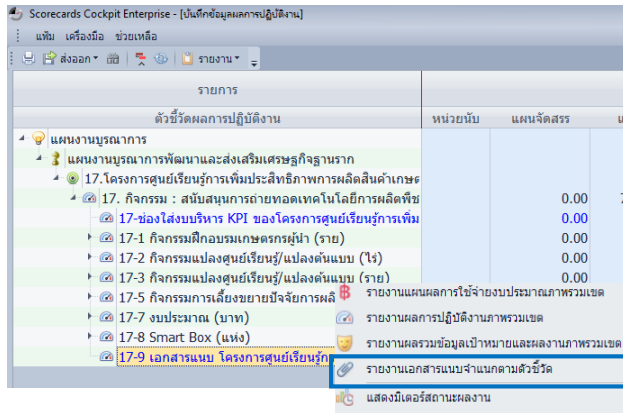


1. คลิกขีวิตตัวชี้วัดที่ต้องการ
2. เลือก “รายงานเอกสารแนบจำแนกตามตัวชี้วัด”

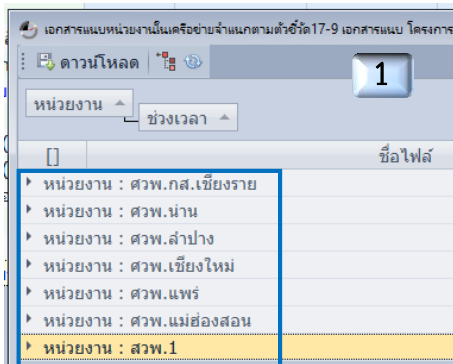

1

แสดงชื่อหน่วยงานทั้งหมดที่แนบไฟล์ข้อมูลแล้ว ภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก

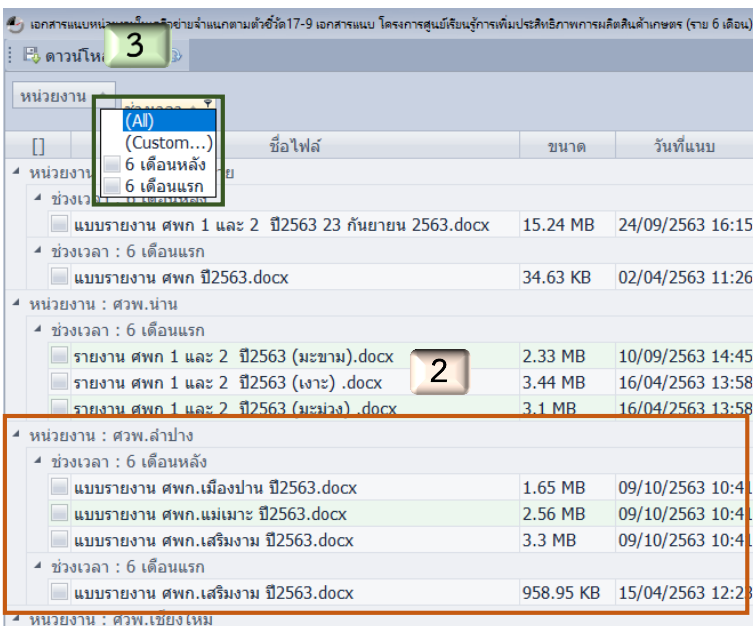


2

แสดงชื่อหน่วยงานที่แนบไฟล์ ตามรอบเวลาที่กำหนด ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ และวัน/เวลาที่แนบไฟล์ภายใต้ตัวชี้วัดที่เลือก

3

สามารถดึงไฟล์ที่หน่วยงานแนบในรอบเวลาเดียวกันได้ โดยการเลือกรอบเวลาที่ต้องการ

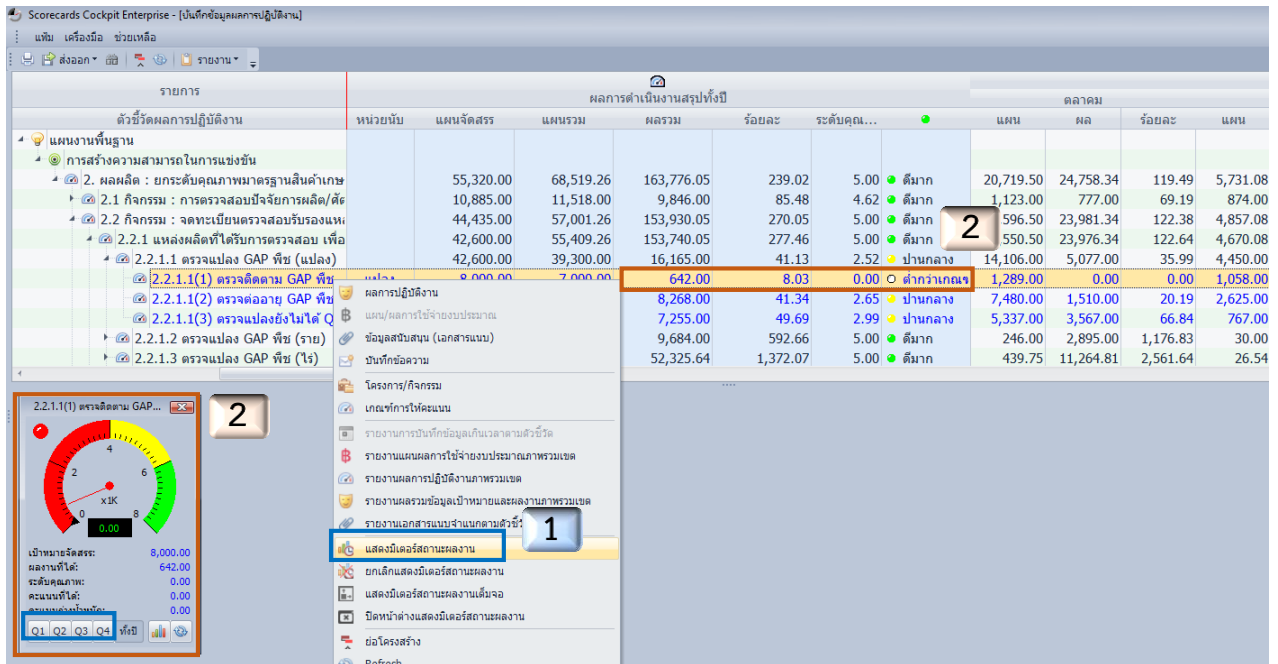

1 คลิกขวา เลือกเมนู “แสดงมิเตอร์สถานะผลงาน” ของตัวชี้วัดที่ต้องการ

2 โปรแกรมจะแสดงสถานะมิเตอร์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานตามระดับของเกณฑ์การให้คะแนน โดย กผง. ตั้งไว้ให้แล้ว ในทุกตัวชี้วัดของทุกหน่วยงานซึ่งโปรแกรมจะประมวลผลอัตโนมัติทุกวันในเวลา 03.00 น.


และสามารถ

- เลือกดูผลมิเตอร์แต่ละไตรมาสได้ (Q1/Q2/Q3/Q4) โดยโปรแกรมจะแสดงสถานะมิเตอร์คำนวณจากการเทียบผลรวมที่ได้จากการบันทึกของทุกหน่วยงาน ณ ไตรมาสนั้นกับผลรวมแผนจัดสรร ดังรูป เลือกไตรมาสที่ 1 ดำเนินการได้ 158 แปลง ซึ่งยังไม่ถึงระดับที่ 1 คือ 800 แปลง ซึ่งอยู่ในช่วงต่ำกว่าเกณฑ์ระดับที่ 1 เมื่อเทียบกับผลรวมแผนจัดสรรที่ทุกหน่วยงานบันทึกภายใต้ตัวชี้วัด “ตรวจติดตาม GAP พืช”



This is a screenshot of the 'เกณฑ์การให้คะแนน' (Scoring Criteria) form. It shows a table with columns for 'เกณฑ์การให้คะแนน' (Scoring Criteria), 'วิธีคำนวณผล' (Calculation Method), and 'กำหนดค่า' (Set Value). The table lists various scoring criteria for the '2.2.1.1(1) ตรวจสอบตาม GAP พืช' KPI. The 'ระดับที่1' (Level 1) is highlighted with a red box, showing a value of 800.00.



- เลือกดูผลมิเตอร์ในรูปแบบกราฟได้ โดยโปรแกรมจะแสดงผลรวมของแผน/ผลการปฏิบัติงานที่ทุกหน่วยงานบันทึกภายใต้ตัวชี้วัด “ตรวจติดตาม GAP พืช” เป็นรายเดือน

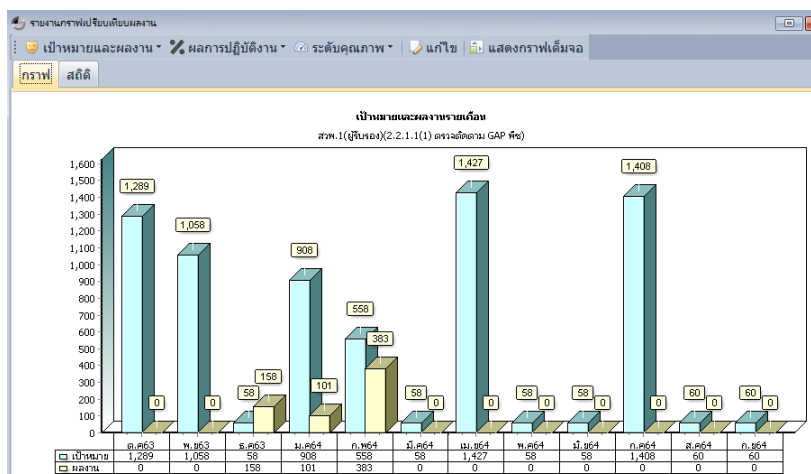

5. การเรียกดูรายงานอื่น ๆ ตรงเมนู “รายงาน”

32


- ผลการปฏิบัติงานจำแนกตามหน่วยงาน เพื่อ monitor ดูหน้าจอของหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรอง โดยเลือกเข้าที่ละหน่วยงาน ในหน้าจอจะแสดงจำนวนข้อความ จำนวนเอกสารแนบ จำนวนครั้งที่บันทึกเกินเวลา หน่วยนับ แผนจัดสรร แผนรวม/ผลรวม/ร้อยละทั้งปี ระดับคุณภาพ มิเตอร์ แสดงสถานะผลงาน แผน/ผล/ร้อยละรายเดือน/รายไตรมาส วัน/เวลาบันทึกรายเดือน

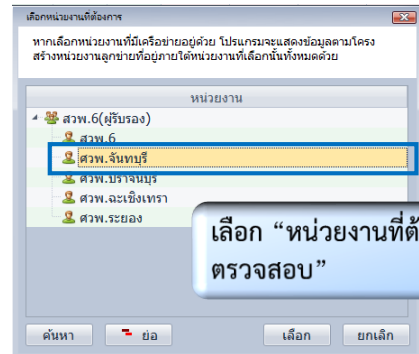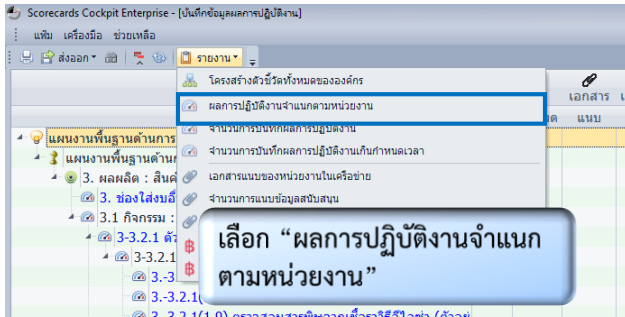

(1) ดูบันทึกข้อความของหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายงานผลการปฏิบัติงานหน่วยงาน ศวพ.จันทบุรี					
รายการ		ข้อความ	เอกสาร	เกินเวลา	
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน		ใหม่	ทั้งหมด	แนบ	เกินเวลา (ครั้ง)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน					
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (1แผนงาน)					
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน					
3. ผลผลิต : สืบค้นเอกสารมีคุณภาพได้มาตรฐาน					
3.1 กิจกรรม : การตรวจปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแล					
3-3.2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรม. (งบประมาณ)					
3-3.2.4(1) ออกใบอนุญาตตาม พรม.		2	2		
3-3.2.4(1.3) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช					
3-3.2.4(1.3.8)ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช (ฉบับ)*					
3-3.2.4(1.3.8.2)ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช (ใบอนุญาต)					
3-3.2.4(1.5) พระราชบัญญัติพืช (11,672 ฉบับ) (ฉบับ)		1	1		
3-3.2.4(1.5.1)ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.พืช (11,592 ฉบับ) (ฉบับ)		1	1		
3-3.2.4(1.6) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (7,499 ฉบับ) (ฉบับ)		1	1		
3-3.2.4(1.6.1)ออกใบอนุญาตตาม พรม.วัตถุอันตราย (7,459 ฉบับ)		1	1		
3-3.2.5 การตรวจร้านค้า/สินค้าเกษตร (งบประมาณ)					
3-3.2.5(1)ตรวจสินค้า/ตรวจร้านค้า*					
3-3.2.5(1.2) ตรวจสินค้าจากผู้จำหน่าย(ร้านค้า) (พืช วัตถุอันตราย เมล็ด)					
3-3.2.5(1.2.42) จันทบุรี ตลาด(ศวพ.จันทบุรี) (ครั้ง)					
3-3.2.5(1.1.5) ปาล์มน้ำมัน (แปลง)					
3-3.2.5(2) โครงการร้าน Q-shop*					
3-3.2.5(2.1) การตรวจประเมิน/ตรวจติดตาม (ครั้ง)**					


1. คลิกขวาที่ตัวชี้วัดที่ต้องการ
2. เลือก “บันทึกข้อความ”

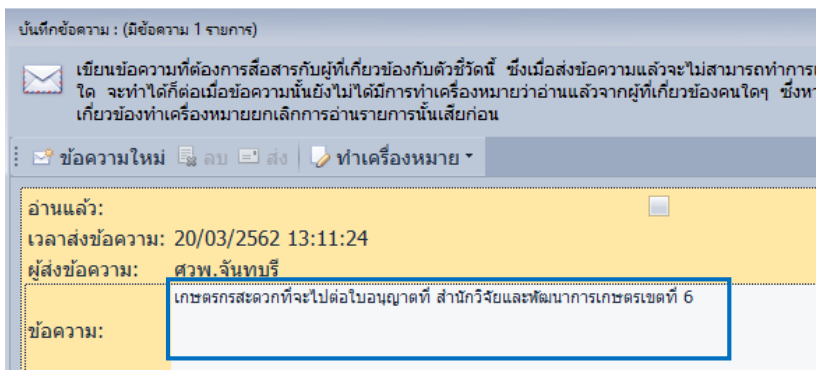


แสดงข้อความ/หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายหรือความก้าวหน้าของการดำเนินงาน/รายละเอียดเพิ่มเติม

- เอกสารแนบของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มรายงาน จากทุกตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน และสามารถกรองช่วงเวลาที่ต้องการดึงข้อมูลได้

34

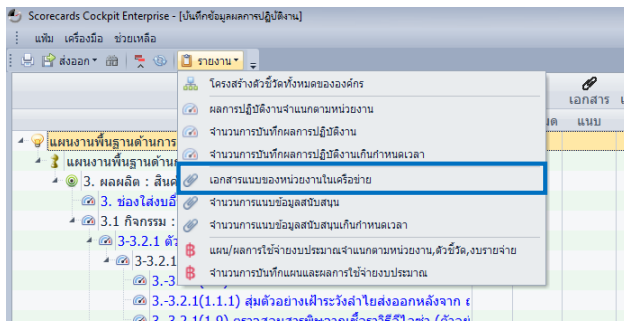


เลือก “เอกสารแนบของ
หน่วยงานเครือข่าย”

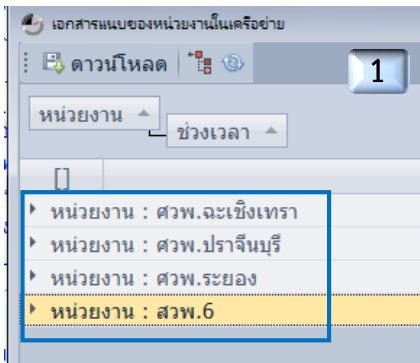

1

แสดงชื่อหน่วยงานทั้งหมดที่แนบไฟล์ข้อมูลแล้ว โดยประมวลผลมาจากทุกตัวชี้วัดที่แต่ละหน่วยงานแนบข้อมูล

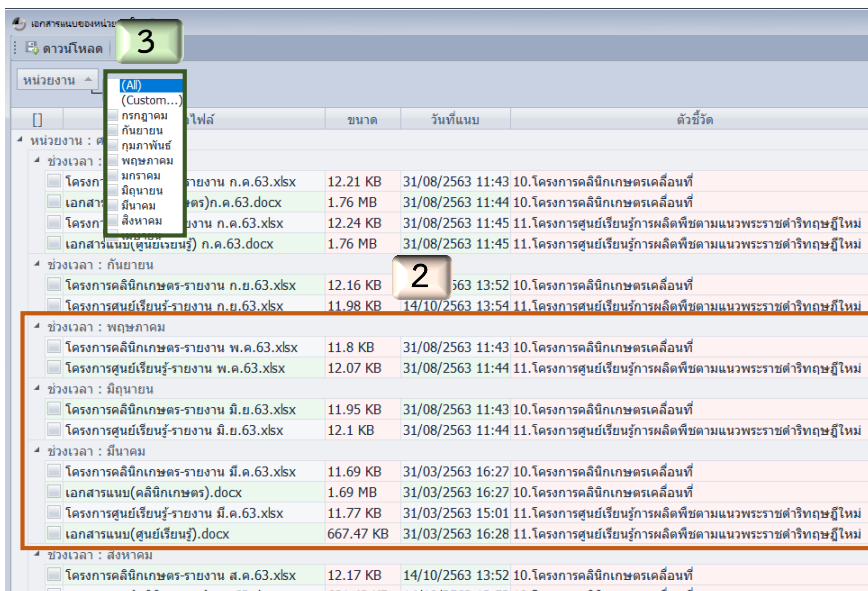

2

แสดงชื่อหน่วยงานที่แนบไฟล์ ตามรอบเวลาที่กำหนด ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ และวัน/เวลาที่แนบไฟล์ และชื่อตัวชี้วัดที่แนบไฟล์

3

สามารถดึงไฟล์ที่หน่วยงานแนบในรอบเวลาเดียวกันได้ โดยการเลือกรอบเวลาที่ต้องการ

6. การส่งออกข้อมูล

35

ในหน้าจอเริ่มต้น จะปรากฏข้อมูลที่โปรแกรมประมวลผลจากการบันทึกของหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้รับรองที่มีแผนปฏิบัติของแต่ละตัวชี้วัด จะแสดงข้อมูลตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนจัดสรร แผนรวม/ผลรวม/ร้อยละทั้งปี ระดับคุณภาพ มิเตอร์แสดงสถานะผลงาน แผน/ผล/ร้อยละรายเดือน/รายไตรมาส และสามารถส่งออกในรูปแบบไฟล์ Excel โดยสามารถปรับแต่ง หรือเลือกข้อมูลเพื่อรายงานผลได้เลย

คลิกเมนู “ส่งออก” แล้วเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการ

รายการ	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับคุณ...
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		32,476.00	146,359.00	196,582.22	134.32	5.00 ● ดีมาก
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและ		9,099.00	9,078.00	13,413.00	147.75	5.00 ● ดีมาก
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการ		1,295.00	1,315.00	1,058.00	80.46	4.27 ● ดีมาก
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการ		1,295.00	1,315.00	1,058.00	80.46	4.27 ● ดีมาก
3-3.2.1(1.1) การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างพืชผักส่งออก	ตัวอย่าง	50.00	50.00	70.00	140.00	5.00 ● ดีมาก
3-3.2.1(1.1.1) สุ่มตัวอย่างเฝ้าระวังลำไยส่งออกหลังจาก	ตัวอย่าง	50.00	50.00	70.00	140.00	5.00 ● ดีมาก
3-3.2.1(1.9) ตรวจสอบสารพิษจากเชื้อราอีโคโนลา (ตัวอย่าง	ตัวอย่าง	25.00	25.00	10.00	40.00	2.60 ● ปานกลาง
3-3.2.1(1.10) ตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืช ดินและน้ำ (ตัวอย่าง	ตัวอย่าง	50.00	50.00	95.00	190.00	5.00 ● ดีมาก
3-3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	450.00	470.00	233.00	51.78	3.07 ● ปานกลาง
3-3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	60.00	60.00	124.00	206.67	5.00 ● ดีมาก
3-3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	50.00	50.00	136.00	272.00	5.00 ● ดีมาก
3-3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	185.00	185.00	54.00	29.19	2.17 ● ปรับปรุงแก้ไข
3-3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	50.00	50.00	78.00	156.00	5.00 ● ดีมาก
3-3.2.1(1.27) รดกอินทรีย์ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	25.00	25.00	5.00	20.00	1.67 ● ปรับปรุงแก้ไข
3-3.2.1(1.31) การวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยป้อน (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	50.00	50.00	34.00	68.00	3.72 ● ดี
3-3.2.1(1.33) คลื่นวิทยุ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	250.00	250.00	149.00	59.60	3.38 ● ปานกลาง
3.2.2 ใบรับรองสุขอนามัย*		3,000.00	3,000.00	9,194.00	306.47	5.00 ● ดีมาก
3.2.2.1 ใบรับรองสุขอนามัยผัก/ผลไม้ส่งออก*	ฉบับ	3,000.00	3,000.00	9,194.00	306.47	5.00 ● ดีมาก
3.2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรบ.		3,800.00	3,016.00	2,523.00	83.65	3.66 ● ดีมาก

ตัวอย่างรายงานที่ส่งออกในรูปแบบไฟล์นามสกุล Excel

ภาพ.6-บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงาน [Compatibility Mode] - Excel

รายการ	หน่วยนับ	แผนจัดสรร	แผนรวม	ผลรวม	ร้อยละ	ระดับ	แผน	ผล
2. ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		32,476.00	146,359.00	196,582.22	134.32	5 ดีมาก	916	2,744.38
2.1 กิจกรรม : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรอง		9,099.00	9,078.00	13,413.00	147.75	5 ดีมาก	604	1,652.00
3.2.1 ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการ		1,295.00	1,315.00	1,058.00	80.46	4.27 ดีมาก	95	182
3.2.1(1) ตัวอย่างปัจจัยการผลิต/สินค้าพืช/ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการ		1,295.00	1,315.00	1,058.00	80.46	4.27 ดีมาก	95	182
3-3.2.1(1.1) การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างพืชผัก	ตัวอย่าง	50	50	70	140	5 ดีมาก	10	10
3-3.2.1(1.1.1) สุ่มตัวอย่างเฝ้าระวังลำไยส่งออกหลังจาก	ตัวอย่าง	50	50	70	140	5 ดีมาก	10	10
3-3.2.1(1.9) ตรวจสอบสารพิษจากเชื้อราอีโคโนลา	ตัวอย่าง	25	25	10	40	2.6 ปานกลาง	0	0
3-3.2.1(1.10) ตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืช ดินและน้ำ	ตัวอย่าง	50	50	95	190	5 ดีมาก	0	0
3-3.2.1(1.12) ดิน (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	450	470	233	51.78	3.07 ปานกลาง	5	7
3-3.2.1(1.13) ปุ๋ยเคมี (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	60	60	124	206.67	5 ดีมาก	10	35
3-3.2.1(1.14) ปุ๋ยอินทรีย์ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	50	50	136	272	5 ดีมาก	10	60
3-3.2.1(1.16) พืช (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	185	185	54	29.19	2.17 ปรับปรุงแก้ไข	10	13
3-3.2.1(1.17) น้ำ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	50	50	78	156	5 ดีมาก	10	26
3-3.2.1(1.27) รดกอินทรีย์ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	25	25	5	20	1.67 ปรับปรุงแก้ไข	0	0
3-3.2.1(1.31) การวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยป้อน (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	50	50	34	68	3.72 ดี	10	0
3-3.2.1(1.33) คลื่นวิทยุ (ตัวอย่าง)	ตัวอย่าง	250	250	149	59.6	3.38 ปานกลาง	20	21
3.2.2 ใบรับรองสุขอนามัย*		3,000.00	3,000.00	9,194.00	306.47	5 ดีมาก	250	1,164.00
3.2.2.1 ใบรับรองสุขอนามัยผัก/ผลไม้ส่งออก*	ฉบับ	3,000.00	3,000.00	9,194.00	306.47	5 ดีมาก	250	1,164.00
3.2.4 การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย พรบ.		3,800.00	3,016.00	2,523.00	83.65	3.66 ดีมาก	160	200
3.2.4.3 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช		1,000.00	847	1,105.00	130.46	5 ดีมาก	0	4
3.2.4.3(8) ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชตาม พ.ร.บ.พันธุ์		1,000.00	847	1,105.00	130.46	5 ดีมาก	0	4
3.2.4.3(8.1) ออกใบอนุญาต ตามใบอนุญาต พ.ร.บ.	ฉบับ	1,000.00	847	1,105.00	110.5	5 ดีมาก	0	4

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการเกษตร			ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			
		กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ งานวิชาการ เกษตร	กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่การ ใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัย การผลิตฯ	กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบรับรอง แหล่งผลิตพืช		กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการ ผลิต	กิจกรรม : การแปรรูป วัตถุดิบพืช สมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ	โครงการ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
1	กพร.										
2	สชช.			✓							
3	กตน.										
4	สลก.										
5	กกจ.										
6	กผง.										
7	ศทส.										
8	กปร.										
9	สนก.				✓						
10	กคง.										
11	กมพ.				✓	✓					
12	สทช.		✓	✓	✓	✓					
13	สอพ.		✓	✓	✓	✓	✓			✓	
14	กวป.		✓	✓			✓				
15	สคพ.		✓		✓						
16	สคว.				✓					✓	
	สวศ.(ผู้รับรอง)										
17	สวศ.						✓				
18	ศวศ.เชียงใหม่						✓				
19	ศวศ.ขอนแก่น								✓		

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการเกษตร			ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			
		กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ งานวิชาการ เกษตร	กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่การ ใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัย การผลิตฯ	กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบรับรอง แหล่งผลิตพืช		กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการ ผลิต	กิจกรรม : การแปรรูป วัตถุดิบพืช สมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ	โครงการ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
20	ศวศ.จันทบุรี										
21	ศวศ.สุราษฎร์ธานี										
	กปผ.(ผู้รับรอง)										
22	กปผ.		✓	✓	✓	✓	✓				
23	ศปผ.ขอนแก่น										
	สวร.(ผู้รับรอง)										
24	สวร.										
25	ศวร.เชียงใหม่		✓								
26	ศวร.ขอนแก่น		✓								
27	ศวร.อุบลราชธานี		✓				✓				
28	ศวร.สุพรรณบุรี		✓				✓				
29	ศวร.ชัยนาท		✓				✓				
30	ศวร.นครสวรรค์		✓								
31	ศวร.ระยอง		✓								
32	ศวป.สุราษฎร์ธานี		✓								✓
33	ศวป.กระบี่		✓				✓				
34	ศวร.สงขลา		✓				✓				
	สวส.(ผู้รับรอง)										
35	สวส.						✓		✓		✓
36	ศกส.เชียงใหม่		✓	✓			✓				✓

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการเกษตร			ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			
		กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ งานวิชาการ เกษตร	กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่การ ใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัย การผลิตฯ	กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบรับรอง แหล่งผลิตพืช		กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการ ผลิต	กิจกรรม : การแปรรูป วัตถุดิบพืช สมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ	โครงการ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
37	ศวส.เชียงราย		✓	✓			✓		✓		✓
38	ศว.กส.เพชรบูรณ์		✓	✓			✓				✓
39	ศวส.สุโขทัย		✓								✓
40	ศวส.เลย		✓	✓			✓				✓
41	ศวส.ศรีสะเกษ		✓				✓		✓		✓
42	ศวส.จันทบุรี		✓				✓				✓
43	ศวส.ชุมพร		✓	✓							✓
44	ศวส.ตรัง		✓				✓		✓		✓
45	ศวส.ยะลา		✓				✓				
	กกย.(ผู้รับรอง)										
46	กกย.				✓						
47	ศคย.เชียงราย										
48	ศคย.หนองคาย										
49	ศคย.บุรีรัมย์										
50	ศคย.ฉะเชิงเทรา										
51	ศคย.สุราษฎร์ธานี										
52	ศคย.สงขลา										
	กวม.(ผู้รับรอง)										
53	กวม.				✓	✓				✓	
54	ศวม.เชียงใหม่						✓			✓	

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการเกษตร			ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			
		กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ งานวิชาการ เกษตร	กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่การ ใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัย การผลิตฯ	กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบรับรอง แหล่งผลิตพืช		กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการ ผลิต	กิจกรรม : การแปรรูป วัตถุดิบพืช สมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ	โครงการ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
55	ศวม.พิษณุโลก				✓	✓	✓			✓	
56	ศวม.ขอนแก่น									✓	
57	ศวม.ลพบุรี						✓			✓	
58	ศวม.สุราษฎร์ธานี									✓	
	สวพ.1(ผู้รับรอง)										
59	สวพ.1			✓	✓	✓	✓				
60	ศวพ.กส.เชียงราย		✓		✓	✓	✓				✓
61	ศวพ.แม่ฮ่องสอน		✓		✓	✓	✓				✓
62	ศวพ.เชียงใหม่		✓		✓	✓	✓				✓
63	ศวพ.ลำปาง		✓	✓	✓	✓	✓				
64	ศวพ.แพร่		✓		✓	✓	✓				✓
65	ศวพ.น่าน		✓		✓	✓	✓				
	สวพ.2(ผู้รับรอง)										
66	สวพ.2		✓	✓	✓	✓	✓				✓
67	ศวพ.พิจิตร		✓	✓	✓	✓	✓				
68	ศวพ.สุโขทัย				✓	✓	✓				
69	ศวพ.ตาก		✓	✓	✓	✓	✓				✓
70	ศวพ.อุดรดิตถ์		✓		✓	✓	✓				
71	ศวพ.เพชรบูรณ์		✓		✓	✓	✓				
	สวพ.3(ผู้รับรอง)										

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการเกษตร			ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			
		กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ งานวิชาการ เกษตร	กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่การ ใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัย การผลิตฯ	กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบรับรอง แหล่งผลิตพืช		กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการ ผลิต	กิจกรรม : การแปรรูป วัตถุดิบพืช สมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ	โครงการ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
72	สวพ.3		✓	✓	✓	✓	✓				
73	สวพ.หนองคาย		✓		✓	✓	✓				✓
74	สวพ.กาฬสินธุ์		✓	✓	✓	✓	✓				
75	สวพ.อุดรธานี		✓		✓	✓	✓				
76	สวพ.เลย		✓		✓	✓	✓				
77	สวพ.มุกดาหาร		✓		✓	✓	✓				
78	สวพ.สกลนคร		✓		✓	✓	✓				
79	สวพ.นครพนม		✓	✓	✓	✓	✓				
80	สวพ.ชัยภูมิ				✓	✓	✓				
	สวพ.4(ผู้รับรอง)										
81	สวพ.4			✓	✓	✓	✓				
82	สวพ.บุรีรัมย์		✓		✓	✓	✓				
83	สวพ.นครราชสีมา		✓		✓	✓	✓			✓	
84	สวพ.โนนสูง		✓		✓	✓	✓				
85	สวพ.อำนาจเจริญ		✓	✓	✓	✓	✓				
86	สวพ.มหาสารคาม		✓		✓	✓	✓		✓		
87	สวพ.สุรินทร์				✓	✓	✓				
88	สวพ.ร้อยเอ็ด		✓	✓	✓	✓	✓				
89	สพก.ภูสิงห์		✓		✓	✓	✓				
90	สวพ.ยโสธร				✓	✓	✓				

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการเกษตร			ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			
		กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ งานวิชาการ เกษตร	กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่การ ใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัย การผลิตฯ	กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบรับรอง แหล่งผลิตพืช		กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการ ผลิต	กิจกรรม : การแปรรูป วัตถุดิบพืช สมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ	โครงการ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
	สวพ.5(ผู้รับรอง)										
91	สวพ.5		✓	✓	✓	✓	✓				
92	ศวพ.กาญจนบุรี		✓	✓	✓	✓	✓				
93	ศวพ.เพชรบุรี		✓		✓	✓	✓				✓
94	ศวพ.ราชบุรี		✓		✓	✓	✓				
95	ศวพ.นครปฐม		✓		✓	✓	✓				
96	ศวพ.ปทุมธานี			✓	✓	✓	✓				
97	ศวพ.อุทัยธานี		✓		✓	✓	✓				
98	ศวพ.นครสวรรค์		✓		✓	✓	✓				
	สวพ.6(ผู้รับรอง)										
99	สวพ.6			✓	✓	✓	✓				
100	ศวพ.จันทบุรี		✓	✓	✓	✓	✓				✓
101	ศวพ.ปราจีนบุรี		✓		✓	✓	✓				
102	ศวพ.ฉะเชิงเทรา			✓	✓	✓	✓				
103	ศวพ.ระยอง			✓	✓	✓	✓				
	สวพ.7(ผู้รับรอง)										
104	สวพ.7			✓	✓	✓	✓				
105	ศวพ.นครศรีธรรมราช			✓	✓	✓	✓				
106	ศวพ.สุราษฎร์ธานี		✓	✓	✓	✓	✓				
107	ศวพ.กระบี่		✓	✓	✓	✓	✓				✓

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการเกษตร			ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงานอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร			
		กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ งานวิชาการ เกษตร	กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่การ ใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัย การผลิตฯ	กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบรับรอง แหล่งผลิตพืช		กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการ ผลิต	กิจกรรม : การแปรรูป วัตถุดิบพืช สมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ	โครงการ ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์
108	ศวพ.ระนอง		✓		✓	✓	✓				
109	ศวพ.ภูเก็ต		✓		✓	✓	✓				✓
110	ศวพ.พังงา		✓		✓	✓	✓				
111	ศวพ.ชุมพร		✓	✓	✓	✓	✓				
	สวพ.8(ผู้รับรอง)										
112	สวพ.8			✓	✓	✓	✓				
113	ศวพ.สงขลา		✓		✓	✓	✓				
114	ศวพ.ร้อยเอ็ด		✓		✓	✓	✓				
115	ศวพ.ปัตตานี		✓		✓	✓	✓				
116	ศวพ.ตรัง		✓		✓	✓	✓				
117	ศวพ.นราธิวาส		✓		✓	✓	✓				
118	ศวพ.พัทลุง		✓	✓	✓	✓	✓				
119	ศวพ.ยะลา		✓		✓	✓	✓				
120	ศวพ.สตูล		✓	✓	✓	✓	✓				

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการระบบ ส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ รองรับการวิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตัญชา	โครงการพัฒนา เทคโนโลยีเกษตร อัจฉริยะ	โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน		โครงการตำบลมั่นคง ยั่งยืน ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร	โครงการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจชายแดน
					กิจกรรม : พัฒนา เกษตรอินทรีย์	กิจกรรม : เกษตร ทฤษฎีใหม่			
1	กพร.								
2	สชช.								
3	กตน.								
4	สลก.								
5	กกจ.								
6	กผง.								
7	ศทส.			✓					
8	กปร.								
9	สนก.								
10	กคง.								
11	กมพ.				✓				
12	สทช.	✓						✓	
13	สอพ.	✓		✓				✓	
14	กwap.								
15	สคพ.								
16	สคว.							✓	
	สวศ.(ผู้รับรอง)								
17	สวศ.			✓					
18	ศวศ.เชียงใหม่								
19	ศวศ.ขอนแก่น								

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตัญชา	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		โครงการตำบลมั่นคง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
					กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์	กิจกรรม : เกษตรทฤษฎีใหม่			
20	ศวศ.จันทบุรี			✓					
21	ศวศ.สุราษฎร์ธานี								
	กปผ.(ผู้รับรอง)								
22	กปผ.	✓		✓				✓	
23	ศปผ.ขอนแก่น	✓							
	สวร.(ผู้รับรอง)								
24	สวร.								
25	ศวร.เชียงใหม่							✓	
26	ศวร.ขอนแก่น			✓				✓	
27	ศวร.อุบลราชธานี	✓						✓	
28	ศวร.สุพรรณบุรี	✓							
29	ศวร.ชัยนาท							✓	
30	ศวร.นครสวรรค์								
31	ศวร.ระยอง							✓	
32	ศวป.สุราษฎร์ธานี								
33	ศวป.กระบี่								
34	ศวร.สงขลา						✓		
	สวส.(ผู้รับรอง)								
35	สวส.			✓					
36	ศกล.เชียงใหม่							✓	

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตัญชา	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		โครงการตำบลมั่นคง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
					กิจกรรม : พัฒนา เกษตรอินทรีย์	กิจกรรม : เกษตร ทฤษฎีใหม่			
37	ศวส.เชียงราย								
38	ศว.กส.เพชรบูรณ์							✓	
39	ศวส.สุโขทัย								
40	ศวส.เลย								
41	ศวส.ศรีสะเกษ	✓							
42	ศวส.จันทบุรี			✓					
43	ศวส.ชุมพร			✓				✓	
44	ศวส.ตรัง								
45	ศวส.ยะลา						✓		
	กกย.(ผู้รับรอง)								
46	กกย.								
47	ศคย.เชียงราย								
48	ศคย.หนองคาย								
49	ศคย.บุรีรัมย์								
50	ศคย.ฉะเชิงเทรา								
51	ศคย.สุราษฎร์ธานี								
52	ศคย.สงขลา								
	กวม.(ผู้รับรอง)								
53	กวม.								
54	ศวม.เชียงใหม่								

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการระบบ ส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ รองรับการวิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตัญชา	โครงการพัฒนา เทคโนโลยีเกษตร อัจฉริยะ	โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน		โครงการตำบลมั่นคง ยั่งยืน ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร	โครงการพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจชายแดน
					กิจกรรม : พัฒนา เกษตรอินทรีย์	กิจกรรม : เกษตร ทฤษฎีใหม่			
55	ศวม.พิษณุโลก								
56	ศวม.ขอนแก่น								
57	ศวม.ลพบุรี	✓						✓	
58	ศวม.สุราษฎร์ธานี								
	สวพ.1(ผู้รับรอง)								
59	สวพ.1				✓			✓	
60	ศวพ.กส.เชียงราย				✓			✓	
61	ศวพ.แม่ฮ่องสอน	✓			✓			✓	
62	ศวพ.เชียงใหม่				✓			✓	
63	ศวพ.ลำปาง	✓			✓			✓	
64	ศวพ.แพร่	✓			✓			✓	
65	ศวพ.น่าน				✓			✓	
	สวพ.2(ผู้รับรอง)								
66	สวพ.2	✓			✓			✓	
67	ศวพ.พิจิตร	✓			✓			✓	
68	ศวพ.สุโขทัย	✓			✓			✓	
69	ศวพ.ตาก				✓			✓	
70	ศวพ.อุดรดิตถ์	✓			✓			✓	
71	ศวพ.เพชรบูรณ์	✓			✓			✓	
	สวพ.3(ผู้รับรอง)								

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตัญชา	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		โครงการตำบลมั่นคง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
					กิจกรรม : พัฒนา เกษตรอินทรีย์	กิจกรรม : เกษตร ทฤษฎีใหม่			
72	สวพ.3	✓		✓	✓			✓	
73	สวพ.หนองคาย	✓			✓			✓	
74	สวพ.กาฬสินธุ์	✓			✓			✓	
75	สวพ.อุดรธานี	✓		✓	✓			✓	
76	สวพ.เลย	✓			✓			✓	
77	สวพ.มุกดาหาร	✓			✓			✓	
78	สวพ.สกลนคร	✓			✓			✓	
79	สวพ.นครพนม	✓			✓			✓	
80	สวพ.ชัยภูมิ	✓		✓	✓			✓	
	สวพ.4(ผู้รับรอง)								
81	สวพ.4	✓			✓			✓	
82	สวพ.บุรีรัมย์	✓			✓			✓	
83	สวพ.นครราชสีมา				✓			✓	
84	สวพ.โนนสูง	✓			✓			✓	
85	สวพ.อำนาจเจริญ	✓			✓			✓	
86	สวพ.มหาสารคาม	✓			✓			✓	
87	สวพ.สุรินทร์	✓			✓			✓	
88	สวพ.ร้อยเอ็ด	✓			✓			✓	
89	สพก.ภูสิงห์	✓			✓			✓	
90	สวพ.ยโสธร	✓			✓			✓	

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตัญชา	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		โครงการตำบลมั่นคง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
					กิจกรรม : พัฒนา เกษตรอินทรีย์	กิจกรรม : เกษตร ทฤษฎีใหม่			
	สวพ.5(ผู้รับรอง)								
91	สวพ.5	✓		✓	✓			✓	
92	สวพ.กาญจนบุรี	✓			✓			✓	
93	สวพ.เพชรบุรี				✓			✓	
94	สวพ.ราชบุรี	✓			✓			✓	
95	สวพ.นครปฐม	✓			✓			✓	
96	สวพ.ปทุมธานี	✓			✓			✓	
97	สวพ.อุทัยธานี	✓			✓			✓	
98	สวพ.นครสวรรค์	✓		✓	✓			✓	
	สวพ.6(ผู้รับรอง)								
99	สวพ.6	✓			✓			✓	
100	สวพ.จันทบุรี	✓			✓			✓	
101	สวพ.ปราจีนบุรี	✓			✓			✓	
102	สวพ.ฉะเชิงเทรา	✓			✓			✓	
103	สวพ.ระยอง	✓		✓	✓			✓	
	สวพ.7(ผู้รับรอง)								
104	สวพ.7			✓	✓			✓	
105	สวพ.นครศรีธรรมราช				✓			✓	
106	สวพ.สุราษฎร์ธานี	✓			✓			✓	
107	สวพ.กระบี่	✓			✓			✓	

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตัญชา	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		โครงการตำบลมั่นคง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
					กิจกรรม : พัฒนาเกษตรอินทรีย์	กิจกรรม : เกษตรทฤษฎีใหม่			
108	ศวพ.ระนอง	✓			✓			✓	
109	ศวพ.ภูเก็ต				✓			✓	
110	ศวพ.พังงา	✓			✓			✓	
111	ศวพ.ชุมพร	✓			✓			✓	
	ศวพ.8(ผู้รับรอง)								
112	ศวพ.8				✓		✓	✓	
113	ศวพ.สงขลา						✓	✓	
114	ศวพ.รือเสาะ	✓			✓		✓	✓	
115	ศวพ.ปัตตานี	✓			✓		✓	✓	
116	ศวพ.ตรัง	✓			✓			✓	
117	ศวพ.นราธิวาส	✓			✓		✓	✓	
118	ศวพ.พัทลุง	✓			✓			✓	
119	ศวพ.ยะลา	✓			✓		✓	✓	
120	ศวพ.สตูล	✓			✓			✓	

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการตำบลมั่นคงยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
		กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัยการผลิตฯ	กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช		กิจกรรม : การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ				
1	กพร.											
2	สชช.											
3	กตน.											
4	สลก.											
5	กกจ.											
6	กผง.											
7	ศทส.											
8	กปร.											
9	สนก.			✓								
10	กคง.											
11	กมพ.				✓							
12	สทช.	✓	✓						✓			✓
13	สอพ.	✓	✓			✓			✓	✓		✓
14	กวป.	✓	✓			✓						
15	สคพ.	✓										
16	สคว.			✓								✓
	สวศ.(ผู้รับรอง)											
17	สวศ.					✓				✓		

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ ความรู้และนวัตกรรมด้าน		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงาน อื่น เนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		โครงการ ระบบ ส่งเสริม เกษตร แบบแปลง ใหญ่	โครงการ พัฒนา เทคโนโลยี เกษตร อัจฉริยะ	โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จังหวัด ชายแดน ภาคใต้	โครงการศูนย์ เรียนรู้การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตสินค้า เกษตร
		กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่ การใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัย การผลิตฯ	กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบ รับรองแหล่ง ผลิตพืช		กิจกรรม : การแปรรูป วัตถุดิบพืช สมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนา เป็นศูนย์กลาง การผลิตเมล็ด พันธุ์ฯ				
18	ศวศ.เชียงใหม่					✓						
19	ศวศ.ขอนแก่น						✓					
20	ศวศ.จันทบุรี											
21	ศวศ.สุราษฎร์ธานี											
	กปผ.(ผู้รับรอง)											
22	กปผ.	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓
23	ศปผ.ขอนแก่น								✓			
	สวร.(ผู้รับรอง)											
24	สวร.											
25	ศวร.เชียงใหม่	✓										✓
26	ศวร.ขอนแก่น	✓								✓		✓
27	ศวร.อุบลราชธานี	✓				✓			✓			✓
28	ศวร.สุพรรณบุรี	✓				✓			✓			
29	ศวร.ชัยนาท	✓				✓						✓
30	ศวร.นครสวรรค์	✓										
31	ศวร.ระยอง	✓										✓
32	ศวป.สุราษฎร์ธานี	✓										
33	ศวป.กระบี่	✓				✓						
34	ศวร.สงขลา	✓				✓						

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
		กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัยการผลิตฯ	กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช		กิจกรรม : การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ				
	สวส.(ผู้รับรอง)											
35	สวส.					✓	✓					
36	ศกส.เชียงใหม่	✓				✓						✓
37	ศวส.เชียงราย	✓				✓	✓					
38	ศว.กส.เพชรบูรณ์	✓				✓						✓
39	ศวส.สุโขทัย	✓										
40	ศวส.เลย	✓				✓						
41	ศวส.ศรีสะเกษ	✓				✓	✓		✓			
42	ศวส.จันทบุรี	✓				✓						
43	ศวส.ชุมพร	✓										✓
44	ศวส.ตรัง	✓				✓	✓					
45	ศวส.ยะลา	✓				✓						
	กกย.(ผู้รับรอง)											
46	กกย.											
47	ศคย.เชียงราย											
48	ศคย.หนองคาย											
49	ศคย.บุรีรัมย์											
50	ศคย.ฉะเชิงเทรา											
51	ศคย.สุราษฎร์ธานี											

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ ความรู้และนวัตกรรมด้าน		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงาน อื่น เนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		โครงการ ระบบ ส่งเสริม เกษตร แบบแปลง ใหญ่	โครงการ พัฒนา เทคโนโลยี เกษตร อัจฉริยะ	โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จังหวัด ชายแดน ภาคใต้	โครงการศูนย์ เรียนรู้การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตสินค้า เกษตร
		กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่ การใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัย การผลิตฯ	กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบ รับรองแหล่ง ผลิตพืช		กิจกรรม : การแปรรูป วัตถุดิบพืช สมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนา เป็นศูนย์กลาง การผลิตเมล็ด พันธุ์ฯ				
52	ศคย.สงขลา											
	กวม.(ผู้รับรอง)											
53	กวม.				✓							
54	ศวม.เชียงใหม่					✓		✓				
55	ศวม.พิษณุโลก				✓	✓		✓				
56	ศวม.ขอนแก่น							✓				
57	ศวม.ลพบุรี					✓		✓	✓			✓
58	ศวม.สุราษฎร์ธานี											
	สวพ.1(ผู้รับรอง)											
59	สวพ.1		✓	✓	✓	✓						✓
60	ศวพ.กส.เชียงราย	✓				✓						✓
61	ศวพ.แม่ฮ่องสอน	✓				✓			✓			✓
62	ศวพ.เชียงใหม่	✓				✓						✓
63	ศวพ.ลำปาง	✓	✓			✓			✓			✓
64	ศวพ.แพร่	✓				✓			✓			✓
65	ศวพ.น่าน	✓				✓						✓
	สวพ.2(ผู้รับรอง)											
66	สวพ.2	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓
67	ศวพ.พิจิตร	✓				✓			✓			✓

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ ความรู้และนวัตกรรมด้าน		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงาน อื่น เนื่องจาก พระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		โครงการ ระบบ ส่งเสริม เกษตร แบบแปลง ใหญ่	โครงการ พัฒนา เทคโนโลยี เกษตร อัจฉริยะ	โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จังหวัด ชายแดน ภาคใต้	โครงการศูนย์ เรียนรู้การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตสินค้า เกษตร
		กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่ การใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัย การผลิตฯ	กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบ รับรองแหล่ง ผลิตพืช		กิจกรรม : การแปรรูป วัตถุดิบพืช สมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนา เป็นศูนย์กลาง การผลิตเมล็ด พันธุ์ฯ				
68	ศวพ.สุโขทัย					✓			✓			✓
69	ศวพ.ตาก	✓				✓						✓
70	ศวพ.อุตรดิตถ์	✓				✓			✓			✓
71	ศวพ.เพชรบูรณ์	✓				✓			✓			✓
	สวพ.3(ผู้รับรอง)											
72	สวพ.3	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓
73	ศวพ.หนองคาย	✓				✓			✓			✓
74	ศวพ.กาฬสินธุ์	✓				✓			✓			✓
75	ศวพ.อุดรธานี	✓				✓			✓			✓
76	ศวพ.เลย	✓				✓			✓			✓
77	ศวพ.มุกดาหาร	✓				✓			✓			✓
78	ศวพ.สกลนคร	✓				✓			✓			✓
79	ศวพ.นครพนม	✓				✓			✓			✓
80	ศวพ.ชัยภูมิ					✓			✓			✓
	สวพ.4(ผู้รับรอง)											
81	สวพ.4		✓	✓	✓	✓			✓			✓
82	ศวพ.บุรีรัมย์	✓				✓			✓			✓
83	ศวพ.นครราชสีมา	✓				✓		✓				✓
84	ศวพ.โนนสูง	✓				✓			✓			✓

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ ความรู้และนวัตกรรมด้าน		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงาน อื่น เนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		โครงการ ระบบ ส่งเสริม เกษตร แบบแปลง ใหญ่	โครงการ พัฒนา เทคโนโลยี เกษตร อัจฉริยะ	โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จังหวัด ชายแดน ภาคใต้	โครงการศูนย์ เรียนรู้การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตสินค้า เกษตร
		กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่ การใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัย การผลิตฯ	กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบ รับรองแหล่ง ผลิตพืช		กิจกรรม : การแปรรูป วัตถุดิบพืช สมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนา เป็นศูนย์กลาง การผลิตเมล็ด พันธุ์ฯ				
85	ศวพ.อำนาจเจริญ	✓				✓			✓			✓
86	ศวพ.มหาสารคาม	✓				✓	✓		✓			✓
87	ศวพ.สุรินทร์					✓			✓			✓
88	ศวพ.ร้อยเอ็ด	✓				✓			✓			✓
89	ศพก.ภูสิงห์	✓				✓			✓			✓
90	ศวพ.ยโสธร					✓			✓			✓
	สวพ.5(ผู้รับรอง)											
91	สวพ.5	✓	✓	✓	✓	✓			✓			✓
92	ศวพ.กาญจนบุรี	✓				✓			✓			✓
93	ศวพ.เพชรบุรี	✓				✓						✓
94	ศวพ.ราชบุรี	✓				✓			✓			✓
95	ศวพ.นครปฐม	✓				✓			✓			✓
96	ศวพ.ปทุมธานี					✓			✓			✓
97	ศวพ.อุทัยธานี	✓				✓			✓			✓
98	ศวพ.นครสวรรค์	✓				✓			✓	✓		✓
	สวพ.6(ผู้รับรอง)											
99	สวพ.6		✓	✓	✓	✓			✓			✓
100	ศวพ.จันทบุรี	✓				✓			✓			✓
101	ศวพ.ปราจีนบุรี	✓				✓			✓			✓

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่น เนื่องจากพระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
		กิจกรรม : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัยการผลิตฯ	กิจกรรม : จัดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช		กิจกรรม : การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ				
102	ศวพ.ฉะเชิงเทรา		✓			✓			✓			✓
103	ศวพ.ระยอง					✓			✓			✓
	สวพ.7(ผู้รับรอง)											
104	สวพ.7		✓	✓	✓	✓				✓		✓
105	ศวพ.นครศรีธรรมราช					✓						✓
106	ศวพ.สุราษฎร์ธานี	✓				✓			✓			✓
107	ศวพ.กระบี่	✓				✓			✓			✓
108	ศวพ.ระนอง	✓				✓			✓			✓
109	ศวพ.ภูเก็ต	✓				✓						✓
110	ศวพ.พังงา	✓				✓			✓			✓
111	ศวพ.ชุมพร	✓				✓			✓			✓
	สวพ.8(ผู้รับรอง)											
112	สวพ.8		✓	✓	✓	✓					✓	✓
113	ศวพ.สงขลา	✓				✓						✓
114	ศวพ.เรือเสาะ	✓				✓			✓			✓
115	ศวพ.ปัตตานี	✓				✓			✓			✓
116	ศวพ.ตรัง	✓				✓			✓			✓
117	ศวพ.นราธิวาส	✓				✓			✓			✓

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ ความรู้และนวัตกรรมด้าน		ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร		โครงการ ส่งเสริมการ ดำเนินงาน อื่น เนื่องมาจาก พระราชดำริ	โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		โครงการ ระบบ ส่งเสริม เกษตร แบบแปลง ใหญ่	โครงการ พัฒนา เทคโนโลยี เกษตร อัจฉริยะ	โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน จังหวัด ชายแดน ภาคใต้	โครงการศูนย์ เรียนรู้การ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิตสินค้า เกษตร
		กิจกรรม : การบริหาร ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กิจกรรม : การขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่ การใช้ประโยชน์	กิจกรรม : ตรวจปัจจัย การผลิตฯ	กิจกรรม : จดทะเบียน ตรวจสอบ รับรองแหล่ง ผลิตพืช		กิจกรรม : การแปรรูป วัตถุดิบพืช สมุนไพรฯ	กิจกรรม : การพัฒนา เป็นศูนย์กลาง การผลิตเมล็ด พันธุ์ฯ				
118	ศวพ.พัทลุง	✓				✓			✓			✓
119	ศวพ.ยะลา	✓				✓			✓			✓
120	ศวพ.สตูล	✓				✓			✓			✓

ชื่อตัวชีวิตและแบบฟอร์มรายงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่รายงานผ่านโปรแกรม SCE

ตารางที่ 3

ชื่อแฟ้มผลิต/โครงการ ในโปรแกรม SCE	ชื่อตัวชีวิตในโปรแกรม SCE ที่ต้องแนบฟอร์มรายงาน	ชื่อรายงานในหน้าเว็บ http://me.doa.go.th/	รอบการรายงาน
4.1)ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร	โครงการภายใต้ตัวชีวิต 1.4.2 เอกสารแนบ กิจกรรม : ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (ราย 6 เดือน)	ฟอร์มSCE64-ก.ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	ราย 6 เดือน
	1.4.1 เอกสารแนบ กิจกรรม : อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (รายปี)	(new)ฟอร์มSCE64-ก.บริหารความหลากหลาย (รายงานผลการใช้ประโยชน์ฯ)	รายปี
4.2)ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	2.3.1 คติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร (รายเดือน)	ฟอร์มSCE64-ก.การตรวจสอบปัจจัยฯ (รายงานคติที่อยู่ในความรับผิดชอบกรม)	รายเดือน
	2.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร (ราย 6 เดือน)	ฟอร์มSCE64-ก.การตรวจสอบปัจจัยฯ (รายงานผลการปฏิบัติงานของสารวัตรฯ)	ราย 6 เดือน
	2.3.3 รายงานผลการตรวจโรคศัตรูพืช โรคแมลง/โรคม (รายเดือน)	ฟอร์มSCE64-ก.จดทะเบียนตรวจสอบฯ (ตรวจรับรองโรงงาน)	รายเดือน
	2.3.4 รายงานการพัฒนาห้องปฏิบัติการ (รายปี)	ฟอร์มSCE64-รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาห้องปฏิบัติการ(LAB)	รายปี
4.3)โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการภายใต้ตัวชีวิต 3.1.4 เอกสารแนบ (รายงานผลการปฏิบัติงาน รายไตรมาส)	ฟอร์มSCE64-โครงการฯพระราชดำริ	รายไตรมาส
4.4)โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	4.5.1 (รายไตรมาส) โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์	ฟอร์มSCE64-ก.SeedHub(รายงานค.ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์)	รายไตรมาส
	4.5.2 (รายไตรมาส) โครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	ฟอร์มSCE64-ก.SeedHub(รายงานค.หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด)	รายไตรมาส
	4.5.3 (รายปี) การขอรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ISO/IEC	ฟอร์มSCE64-รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาห้องปฏิบัติการ(LAB)	รายปี
	4.5.3 (รายปี) ตรวจติดตามคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	ฟอร์มSCE64-รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาห้องปฏิบัติการ(LAB)	รายปี
	4.5.5 (ราย 6 เดือน) กิจกรรม : แปรรูปวัตถุผสมสมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน	ใช้แบบฟอร์มเดียวกับสถาบันวิจัยพืชสวน (ยังไม่ได้อัปโหลดฟอร์มขึ้นเว็บไซต์)	ราย 6 เดือน *รายงานครั้งแรก 15 เม.ย. 64
4.5)โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	โครงการภายใต้ตัวชีวิต 5.10.1 เอกสารรายงานการฝึกอบรม(เอกสาร)	ฟอร์มSCE64-โครงการแปลงใหญ่-รายงานผลการถ่ายทอดความรู้(ปญ64-01)	จัดทำรายงานผลแจ้งหัวหน้าหน่วยงานหลังจากดำเนินการถ่ายทอดความรู้เสร็จสิ้นแล้ว ภายใน 60 วันทำการแล้วแนบไฟล์สำเนา รายงานในโปรแกรม SCE
	โครงการภายใต้ตัวชีวิต 5.10.2 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย6เดือน) และ5.10.3 เอกสารรายงานความก้าวหน้า(ราย12เดือน)	ฟอร์มSCE64-โครงการแปลงใหญ่(ปญ64-02)	ราย 6 เดือน
4.8)โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	โครงการภายใต้ตัวชีวิต 8.7 เอกสารแนบ	ฟอร์มSCE64-โครงการเกษตรอัจฉริยะ รอบ 6 เดือน	ราย 6 เดือน
		ฟอร์มSCE64-โครงการเกษตรอัจฉริยะ รอบ 12 เดือน	ราย 6 เดือน
4.9)โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการภายใต้ตัวชีวิต 9.5 เอกสารแนบ	ฟอร์มSCE64-โครงการตำบลมั่นคงฯจังหวัดชายแดนภาคใต้	รายเดือน
4.10)โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	10-5 เอกสารแนบ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	ฟอร์มSCE64-โครงการ ศพก.	ราย 6 เดือน
